



## INTERNA EVALUACIJA PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A SAVA 2014-2020 U RAZDOBLJU OD 2017. DO 2020. GODINE

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPJSKE UNIJE

Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)"

LAG SAVA



PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

UDIO SUFINANCIRANJA 90% EU, 10% HR

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

## Sadržaj

<b>OSOBNA ISKAZNICA LAG-A SAVA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. NAZIV PROJEKTA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. SAŽETAK PROJEKTA .....</b>	<b>4</b>
2.1. OSNOVNE INFORMACIJE IZ UGOVORA I SPORAZUMA OSNOVNE OBVEZE SUKLADNO UGOVORU: .....	4
2.1.1. OSNOVNE OBVEZE SUKLADNO SPORAZUMU O SURADNJI S AGENCIJOM ZA PLAĆANJA: .....	5
2.1.2. SPORAZUM O POVJERLJIVOSTI - OBVEZE: .....	6
2.1.3.....	6
2.2. UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA (NAKON UVEĆANJA SREDSTAVA).....	7
2.3. CILJEVI I MJERE LRS LAG-A SAVA 2014-2020 .....	8
2.3.1. <i>Ciljevi i mjere LRS LAG-a SAVA 2014-2020.</i> .....	8
2.4. OČEKIVANI REZULTATI I INDIKATORI LRS LAG-A SAVA 2014-2020 .....	10
2.4.1. <i>Praćenje provedbe LRS putem pokazatelja isporuka (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja rezultata. LEADER pokazatelji u okviru ZPP indikatora označeni su:(*):</i> .....	11
2.5. PERIOD PROVEDBE PROJEKTA, KOJE JE PREDMET EVALUACIJE .....	13
2.6. CILJEVI EVALUACIJE .....	13
<b>3. OKRUŽENJE.....</b>	<b>13</b>
<b>4. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI .....</b>	<b>16</b>
<b>5. PROCJENA LJUDSKIH KAPACITETA LAG-A SAVA.....</b>	<b>17</b>
<b>6. METODE UPRAVLJANJA PROJEKTOM .....</b>	<b>21</b>
6.1. METODE PROJEKTNOG UPRAVLJANJA.....	21
6.2. METODE UPRAVLJANJA KVALitetom .....	22
6.2.1. <i>Izmjene Lokalne razvojne strategije</i> .....	23
6.2.2. <i>Ostali interni akti LAG-a</i> .....	24
6.3. METODE DISEMINACIJE .....	25
6.4. OSTALE METODE .....	25
<b>7. CILJEVI, MJERE LRS LAG-A SAVA2014-2020, TE OSTVARENI REZULTATI I INDIKATORI .....</b>	<b>26</b>
7.1. SC1 RAZVOJ KONKURETNE POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU LAG-A SAVA I POTICANJE RAZVOJA SPECIFIČNIH OBЛИKA TURIZMA .....	26
7.1.1. <i>TO 1.1.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“</i> .....	29
7.1.2. <i>"Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava"</i> .....	32
7.1.3. <i>TO 1.2.1 „Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma“</i> .....	34
7.2. SC 2 - RAZVOJ KVALITETE ŽIVOTA REVITALIZACIJOM OPĆE DRUŠTVENE POTPORNE INFRASTRUKTURE TE SURADNJE I UMREŽAVANJA U SVRHU SINEGRIJSKOG DJELOVANJA RAZVOJNIH DIONIKA RURALNOG PODRUČJA LAG-A .....	34
7.2.1. <i>TO 2.1.1. – Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru - u sklopu provedbe podmjere 19.2.....</i>	37
7.2.2. <i>TO. 2.2.1 – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a-u sklopu provedbe podmjere 19.3.....</i>	39
7.2.3. <i>Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije u sklopu provedbe podmjere 19.4.....</i>	40
7.3. DODATNI POKAZATELI PROVEDBE I POSTIZANJAREZULTATA .....	45
7.3. DODANA VRIJEDNOST PROVEDBE LRS.....	47
7.3.1. <i>Postignuća/dobrobiti/značaj realizacije Projekta za zajednicu u periodu evaluacije .....</i>	47
7.3.2. <i>Postignuti odnosi LAG-a sa pripadnicima ciljanih skupina i krajnjim korisnicima .....</i>	47
7.3.3. <i>Postignuti odnosi među pripadnicima različitih skupina ciljanih skupina.....</i>	48
7.3.4. <i>Odnosi nastali uslijed realizacije projekta s važnim dionicima u lokalnoj zajednici.....</i>	48
7.3.5. <i>Procesi koji su doveli do postignuća/dobrobiti/značaja Projekta u zajednici .....</i>	49
<b>8. CILJ EVALUACIJE.....</b>	<b>49</b>
<b>9. ZAKLJUČAK.....</b>	<b>51</b>
<b>10. SAŽETAK .....</b>	<b>52</b>
<b>11. POPIS TABLICA .....</b>	<b>54</b>
<b>12. POPIS GRAFOVA:.....</b>	<b>55</b>

## OSOBNA ISKAZNICA LAG-a SAVA

Naziv LAG-a:	Lokalna akcijska grupa „SAVA“				
Adresa sjedišta LAG-a:	Bana Josipa Jelčića 48, 10290 Zaprešić				
Web stranica:	<u><a href="http://www.lagsava.hr/">http://www.lagsava.hr/</a></u>				
Kontakti:	Tel:	+385	(0)1	4008	135
	Mob:	+385	(0)95	5937	630
	E-mail: info@lagsava.hr; maja.cicko@lagsava.hr				
Datum osnivanja/registracije:	17.10.2013.				
OIB:	7345374254				
MB:	4120833				
Registarski broj udruge:	1002966				
RNO:	305991				
IBAN:	HR5924840081106713900				
Broj jedinica lokalne samouprave:	11				
Uključene jedinice lokalne samouprave:	Brdovec, Dubravica, Jastrebasko, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Samobor, Stupnik, Sveta Nedelja, Zaprešić				
NUTS II:	Kontinentalna Hrvatska				
Površina LAG-a (ARKOD):	781,81				
Broj stanovnika (2011.)	124.602				
Glavni izvor financiranja:	M19, Program ruralnog razvoja, RH 2014.-2020. EPFRR (90%), RH (10%)				

## 1. NAZIV PROJEKTA

Predmet Evaluacije je provedba odabrane Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS) LAG-a SAVA te provedba podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u periodu od 2017. do 2019. godine.

## 2. SAŽETAK PROJEKTA

Izvor financiranja:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR / EAIFRD) – Mjera 19 „LEADER- CLLD“

### 2.1. Osnovne informacije iz Ugovora i Sporazuma Osnovne obveze sukladno Ugovoru:

- Ugovor stupa na snagu 20.02.2017. i vrijedi do isteka roka od 5 godina od dana konačne isplate za provedbu podmjera 19.2, 19.3 i 19.4 (zadnja isplata sredstava Korisniku/nositelju projekta za prihvatljive aktivnosti/troškove);
- Ispunjavati uvjete prihvatljivosti do konačne isplate sredstava;
- Javna potpora za provedbu aktivnosti podmjere 19.4. neće premašiti iznos od 25% isplaćene javne potpore u podmjerama 19.2 i 19.3;
- Obveza da LAG do 31.12.2019. odabere projekte u iznosu od najmanje 20% sredstava namijenjenih za provedbu podmjere 19.2;
- Zabranjena je naplata usluga savjetovanja potencijalnih korisnika s LAG područja za pripremu projekata koji se planiraju provoditi putem LRS;
- Poduzeti sve potrebne mjere u svrhu sprječavanja sukoba interesa sukladno definiciji iz članka 40. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) pri korištenju sredstava javne potpore;
- Prilikom odabira projekata niti jedna pojedinačna interesna skupina ne smije imati više od 49% glasačkih prava
- Dostava Godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu „n“ do 15. veljače godine „n+1“

#### 2.1.1. Osnovne obveze sukladno Sporazumu o suradnji s Agencijom za plaćanja:

- Delegiranje provedbe administrativnih provjera koje se odnose na provedbu podmjere 19.2, odnosno provedbu operacija u okviru Lokalne razvojne strategije LAG-a, odabranom LAG-u
- Delegirane administrativne provjere
- Sastaviti i primjeniti odgovarajuće postuke i kriterije za obavljanje delegiranih administrativnih provjera
- Prikupljati, unositi, pohranjivati i razvrstavati podatke o svakom prijavljenom projektu u svrhu praćenja, finansijskog upravljanja, provjera i revizije, a posebno za vrednovanje odabrane LRS
- Sudjelovati u aktivnosti sprječavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti, uključujući sumnju na prijevaru
- Uspostaviti sustave i postupke kojima se osigurava da se svi dokumenti koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga pohranjuju u skladu sa zahtjevima čl. 72 točke (g) Uredbe (EU) 1303/2013
- Omogućiti tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Programa pristup informacijama
- Izraditi interne procedure sukladno Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata (AP), uključujući izmjene i/ili dopune po potrebi
- Surađivati s Upravljačkim tijelom Programa, Agencijom za plaćanja, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa EU, Europskom komisijom, Europskim revizorskim sudom, predstavnicima Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim institucijama koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima
- Obavljati posjet lokaciji ulaganja minimalno jednom tijekom razdoblja provedbe Programa
- Provjera prihvatljivosti korisnika
- Provjera sukladnosti s kriterijima odabira
- Kontrola kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza u okviru operacije za koju se traži potpora
- Kontrola prihvatljivosti troškova operacije, uključujući sukladnost s kategorijom troškova ili metodom izračuna koju je potrebno upotrebljavati ako je operacija ili njen dio obuhvaćen čl. 67 st. 1 točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 1303/2013
- Kontrolu opravdanosti prihvatljivih troškova, za troškove iz čl. 67 st. 1 točke (a)

## Uredbe (EU) 1303/2013

- Provoditi odabranu LRS, sukladno važećim internim procedurama odobrenim od strane nadležnog tijela LAG-a (odobrenje obavezno prije objave LAG natječaja)
- Prilagoditi dokumentaciju aktivacije odabranog tipa operacije (dostavlja AP) sukladno uvjetima i kriterijima iz odabrane LRS te vlastitim internim procedurama; nadležno tijelo LAG-a obavezno usvaja dokumentaciju prije objave LAG natječaja
- Dostava Izjave o ispunjavanju sporazumnih obveza za godinu „n“ do 15. veljače godine „n+1“

### 2.1.2. Sporazum o povjerljivosti - obveze:

- Čuvanje povjerljivosti svih podataka i informacija s kojima odabrani LAG i Agencija za plaćanja dolaze u doticaj provedbom Sporazuma o suradnji i delegiranih administrativnih provjera, a koji su okarakterizirani kao osjetljivi za LAG i/ili AP. Odnosi se na: dokumente, odnosno napisani umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetički, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka, saznanje, mjeru, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informaciju, te bilo koju vrstu osobnih podataka kao i sve klasificirane podatke i informacije sukladno važećim zakonskim propisima.
- Obveza da navedene podatke i informacije neće davati na korištenje trećim osobama niti ih koristiti bez izričitog pisanog pristanka druge sporazumnoj strane, za bilo koju svrhu, osim radi izvršenja sporazumnih obveza
- Osigurati kontinuirano provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite svih osjetljivih podataka i informacija te poduzeti odgovarajuće mjere u vezi vođenja potrebnih zbirki podataka te postupanja s osobnim i klasificiranim podacima i informacijama

## 2.2. Ukupno odobrena sredstva (nakon uvećanja sredstava)

Tablica 1: Ukupno odobrena sredstva LAG-a SAVA za provedbu LRS

		IZNOS NAKNADNE DODJELE SREDSTAVA u HRK Pojašnjenje: <i>Iznos javne potpore utvrđen temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u podmjeri 19.2.</i>	IZNOS POTPORE IZ UGOVORA/ANEKSA UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA ODABRANOM LAG-u Pojašnjenje: <i>Iznos javne potpore za 19.2./3./4. iz Ugovora/Anekса ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u</i>	IZNOS NAKNADNE DODJELE SREDSTAVA (u HRK) PRORAČUNA (90% udjela) u HRK	IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU (90% udjela) u HRK	IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA RH (10% udjela) u HRK
1.	IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.2.	1.478.840,00	7.121.202,17 HRK	8.600.042,17 HRK	7.740.037,95 HRK	860.004,22 HRK
2.	IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.3.	0,00 HRK	356.060,11 HRK	356.060,11 HRK	320.454,10 HRK	35.606,01 HRK
3.	IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.4.	0,00 HRK	1.869.315,57 HRK	1.869.315,57 HRK	1.682.384,01 HRK	186.931,56 HRK
4.	UKUPNO ZA 19.2. / 19.3. / 19.4.	1.478.840,00 HRK	9.346.577,85 HRK	10.825.417,85 HRK	9.742.876,06 HRK	1.082.541,79 HRK

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, Odluka o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a od 4. kolovoza 2020.

## 2.3. Ciljevi i mjere LRS LAG-a SAVA 2014-2020

Tablica 2: Popis izmjena LRS unutar perioda evaluacije

Verzija LRS	Tip izmjene	Period provedbe u evaluacijskom razdoblju
Originalan dokument	-	3.2016.- 18.12.2017.
1 izmjena	Izmjena	18.12.2017 – 16.5.2018..
2 izmjena	Izmjena	16.5.2018.-5.7.2019.
3 izmjena	Izmjena	5.7.2019.-2.9.2020
4 izmjena	Izmjena	2.9.2020.- u tijeku

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020.

### 2.3.1. Ciljevi i mjere LRS LAG-a SAVA 2014-2020

Tablica 3: Strateški razvojni ciljevi (SC), prioritetne mjere (M) i prioritetni tipovi operacija (TO<sup>1</sup>)

Strateški ciljevi (SC) LAG-a u 2014.-2020.	Prioritetne Mjere (M) 2014.-2020. za ostvarenje strateških ciljeva	Prioritetni tipovi operacija (TO) 2014.-2020., za realizaciju mjera kojima se ostvaruju strateški ciljevi
SC1 Razvoj konkurentne poljoprivrede na području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma	M 1.1 Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava	TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava TO 1.1.2 Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava
	M 1.2. Potpora razvoju diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a	TO 1.2.1. Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma

<sup>1</sup> Tip operacije koji se provodi unutar LRS LAG-a SAVA. Za svaki pojedini TO za koji su osigurana sredstva unutar Podmjere 19.2. LAG raspisuje Natječaj

<p>SC2 Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a</p>	<p>M 2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture</p>	<p>TO 2.1.1 Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru</p>
	<p>M 2.2 Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a</p>	<p>TO 2.2.1 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a</p>
		<p>TO 2.2.2 Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije</p>

Izvor: LRS LAG-a SAVA

## 2.4. Očekivani rezultati i indikatori LRS LAG-a SAVA 2014-2020

Tablica 4: Vrednovanje provedbe ukupne LRS putem krovnih pokazatelja (indikatora) rezultata 2018. i do kraja programskog i realizacijskog razdoblja 2023.

Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata/naziv pokazatelja ( <i>result indicators</i> )- Pravilnik, CMES/CMEF									
Godina vrednovanja		Planirana finansijska alokacija (%) , odobreno/isplaćeno		Ukupan broj odobrenih/ sufinanciranih projekata		Ukupna odobrena/isplaćena sredstva (HRK), javni rashodi		Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/ sufinanciranih projekata	
		Odobreno	Isplaćeno	Odobreno	Isplaćeno	Odobreno	Isplaćeno	Odobreno	Isplaćeno
		2018.	2023.	2018.	2023.	2018.	2023.	2018.	2023.
UKUPNO LRS	Ukupno LRS (19.2/19.3/19.4)	17,87	100	14	59	2.508.536,10 HRK	10.825.417,85 HRK	2	3
Strateški cilj LRS	Podmjera Programa ruralnog razvoja 2014-2020 (u dalnjem tekstu PRR) M19								
SC 1	Ukupno LRS	17,87	60,95	14	33	1.536.492,00 HRK	6.597.857,17 HRK	0	1
	19.2	17,87	76,72	14	33	1.536.492,00 HRK	6.597.857,17 HRK	0	1
SC 2	Ukupno LRS (19.2/19.3/19.4)	10,40	39,05	0	12	972.044,10 HRK	4.227.560,68 HRK	2	2
	19.2	0	18,50	0	9	0	2.002.185,00 HRK	0	0
	19.3	0	3,81	0	1	0	356.060,11 HRK	0	0
	19.4	10,0	20	N/A	N/A	972.044,10 HRK	1.869.315,57 HRK	2	2

Izvor: LRS LAG-a SAVA

2.4.1. Praćenje provedbe LRS putem pokazatelja isporuka (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja rezultata. LEADER pokazatelji u okviru ZPP indikatora<sup>2</sup> označeni su:(\*):

Tablica 5: Praćenje provedbe LRS sukladno odabranim Fokus područjima

P <sup>3</sup> PRR	FP <sup>4</sup> PRR	Naziv pokazatelja	CVP <sup>5</sup> 2018 .	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	2	2.2.1	19.3.2	2.2	19/19.3	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	20	2.2.1	19.3.2	2.2	19/19.3	2
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	3	8	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	30	80	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2
1	1B*	Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2) <i>Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013</i>	0	1	2.2.1	19.3.2	2.2	19/19.3	2
1	1B*	Broj projekata transnacionalne suradnje (međunarodna razina) 19.3-19.3.1+19.3.2), <i>Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013</i>	0	0	2.2.1	19.3.2	2.2	19/19.3	2
1	1C	Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	0	4	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2
1	1C*	Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu	0	40	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/index_en.htm)

<sup>3</sup> Prioritet

<sup>4</sup> Fokus (žarišno) područje

<sup>5</sup> Ciljana vrijednost pokazatelja

P <sup>3</sup> PRR	FP <sup>4</sup> PRR	Naziv pokazatelja	CVP <sup>5</sup> 2018 .	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
		osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina							
2	2A*	Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju	0	12	1.1.2	4.1.1	1.1	4/4.1	1
2	2A*	Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG	12	31	1.1.1	6.3.1	1.1	6/6.3	1
6	6A	Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora	0	0	1.2.1	6.4.1	1.2	6/6.4	1
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta	0	2	2.2.1	19.3.2	2.2	19/19.3	2
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta	0	20	2.2.1	19.3.2	2.2	19/19.3	2
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta	1	4	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta	10	40	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2
6	6B	Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	5	15	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2
6	6B	Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	50	150	2.2.2	19.4.1	2.2	19/19.4	2
6	6B*	Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura	15	15	2.1.1	7.4.1	2.1	7/7.4	2

Izvor: Stručna služba LAG-a, prosinac 2020.

## 2.5. Period provedbe projekta, koje je predmet evaluacije

Predmet ovog evaluacijskog postupka je period provedbe projekta od dana donošenja Odluke o odabiru LAG-a 09.01.2017. do 31.12.2020.

## 2.6. Ciljevi evaluacije

Evaluacija se sastoji od evaluacije provedbe LRS LAG-a SAVA te internih akata LAG-a, koji omogućuju postupanje i realizaciju planiranih mjera kojima je bila svrha dostizanje ciljeva usvojenih u LRS.

Također evaluacija uključuje horizontalnu evaluaciju koja obuhvaća tijela donošenja odluka – Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor, operativna tijela za provedbu LRS –Stručnu službu LAG-a, LAG administratore, volontere te praćenje odnosno analizu dosadašnjih godišnjih izvješća o radu, koja se usvajaju na Skupštini te dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava umjesto LRS-om predviđenog korištenja vanjskih stručnjaka za provedbu postupka evaluacije, koristit će se metoda samoprocjene.

## 3. OKRUŽENJE

Početak realizacije ovog Projekta započinje u razdoblju koje se može okarakterizirati kao politički i gospodarski relativno stabilno, uz istovremeno produbljivanje ideoloških razlika u društvu i smanjivanje društvene kohezije.

Nakon dvije politički nestabilne godine (2015. i 2016.) koje karakterizira nestabilna izvršna i zakonodavna vlast i u kojima su se u Republici Hrvatskoj držali dvaput parlamentarni izbori u dvije godine za redom (8.11.2015. i 11.9.2016.), uspostavljena je stabilna izvršna i zakonodavna vlast.

Istovremeno na regionalnoj i lokalnoj razini političko okruženje je bilo stabilno, a predstavnici LAG-a nastavili su dobro uspostavljenu suradnju s jedinicama lokalne samouprave, županijom, gospodarskim i civilnim sektorom.

Zadnja godina koja je obuhvaćena ovom evaluacijom, 2020. ostati će u cijelom Svijetu zapamćena po pandemiji uzrokovanoj virusom COVID-19, radi koje su i dalje u tijeku brojne restrikcije te su bojne djelatnosti prisiljene zaustaviti svoj rad. Pandemija koronavirusa ujedno je velik šok i za europsko i svjetsko gospodarstvo. Države članice već su donijele ili donose

proračunske mjere i politike za likvidnost i povećanje kapaciteta svojih zdravstvenih sustava i pružanje pomoći onim građanima i sektorima koji su posebno pogodjeni.

Da bi se ublažile negativne posljedice na živote građana i gospodarstvo, Europska komisija pokrenula je sveobuhvatan gospodarski odgovor na pandemiju, primijenila potpunu fleksibilnost fiskalnih pravila EU-a, revidirala svoja pravila o državnim potporama i uspostavila investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus u vrijednosti od 37 milijardi eura za pružanje likvidnosti malim poduzećima i sektoru zdravstvene skrbi.

Osim toga, Komisija je 2. travnja 2020. predložila dalekosežne mjere za aktivaciju svih sredstava iz proračuna EU-a kako bi se zaštitili životi i izvori prihoda. Komisija je pokrenula novu inicijativu za potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (engl. Support mitigating Unemployment Risks in Emergency – SURE), čiji je cilj očuvati radna mjesta i podupirati obitelji. Također je predložila da se sva raspoloživa sredstva iz strukturnih fondova preusmjere na suzbijanje koronavirusa. Potporu će dobiti i poljoprivrednici i ribari te oni kojima je pomoć najpotrebnija. Inicijativa Solidarnost EU-a za zdravlje donosi tri milijarde eura za potrebe zdravstvenih sustava država članica.

LAG SAVA je započeo s realizacijom Projekta 2017. godine . Područje LAG-a SAVA obuhvaća jedne od najrazvijenijih te ekonomski najstabilnijih JLS-ova u RH. Obzirom na iznimno visoki indeks razvojenosti svih JLS-ova u sklopu LAG-a, mnogi potencijalni korisnici EU fondova u nepovoljnem su položaju obzirom da se indeks razvojenosti JLS-ova boduje u gotovo svim Natječajima.

Na provedbu ovog Projekta određeni utjecaj imali su i uzastopni parlamentarni izbori koji su prolongirali donošenje odluka Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: APPRRR), vezanih za provedbu LEADER-a, Mjera 19 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 te je cjelokupna provedba LEADER-a kasnila. Tako su prvi objavljeni natječaji na LAG razini, na području Republike Hrvatske bili u 2018. godini. Pri tome treba naglasiti da je provedba LAG natječaja bila moguća tek po dobivanju službenog odobrenja za pojedini tip operacija od strane APPRRR (tzv. Aktivacija)<sup>6</sup> i to

---

<sup>6</sup> Provedba aktivnosti u sklopu podmjere 19.2 – objava natječaja za dionike LAG područja i odlučivanje o potpori

na način da se sve odredbe iz natječaja na nacionalnoj razini moraju preslikati na razini LAG natječaja i to tipovi operacija, uvjeti za prihvatljive korisnike, aktivnosti i troškove te minimalne iznose odobrene za pojedini projekt. Također u ovom periodu APPRR je također bio u procesu učenja te su se ponekad pravila mijenjala „u hodu“ što je otežavalo animaciju dionika na pojedinom LAG području, pa tako i na području LAG-a SAVA. Uspostavljena suradnja s predstavnicima izvršne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini rezultirala je s relativnouspješno provedenim natječajem za TO 2.1.1. "Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru"<sup>7</sup>, a na Natječajima LAG-a sredstva su ostvarivali i poljoprivrednici. Za jedinice lokalne samouprave prvobitno je bio namjenjen iznos od 33.000 EUR-a po JLS za projekte koje će prijaviti no drugom izmjenom LRS iznos je smanjen na 30.000 EUR-a kako bi se omogućilo da što više poljoprivrednika ostvari sredstva. Na Natječaj za TO 2.1.1. namjenjen JLS-ovima od 11 JLS-ova javilo se njih 10 (svi osim Grada Zaprešića) no radi nedostatne dokumentacije dva projekta su odbijena, Općina Pušća i Općina Luka. Trećom izmjenom LRS u kojoj se ukinula Mjera 8 te su za TO 1.1.2 prealocirana preostala sredstva iz TO 1.1.1. kao i dio preostalih sredstava iz TO UR.1.1. smanjila se ukupna preostala alokacija za JLS-ove na 45.000 EUR-a. Navedeni postupak kao i postupak povećanja članarina LAG-u koje plaćaju isključivo JLS-ovi, rezultiralo je izraženim nezadovoljstvom Općine Pušća koje je javno iznešeno u lokalnim tiskovinama uz navođenje nekolicine neistinosti i pogrešnih podataka čime se naštetilo ugledu LAG-a.

Sukladno programskim odredbama LAG SAVA nije mogao financirati projekte posebno namijenjene ranjivim skupinama jer takvih tipova operacija i mjera nije niti bilo u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Za korištenje sredstava na nacionalnoj razini iz Europskog socijalnog fonda ograničavajući faktor prije svega je bio visok stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave, te ograničeni iznosi za plaće (manje od plaća koje su se za iste ili slične poslove mogle ugovoriti na LAG području), no unatoč tome LAG je u svojstvu partnera sudjelovao u projektu pod nazivom Job College SAVA financiranom iz Europskog socijalnog fonda te je na svom području radio s mladim, nezaposlenim osobama. Osim ovog ESF projekta,

---

<sup>7</sup> Provedba aktivnosti u sklopu podmjere 19.2 – objava natječaja za dionike LAG područja i odlučivanje o potpori projektima – moguća je tek od veljače 2018. godine kada je aktiviran prvi tip operacije za LAG natječaje, a sukladno provedbenoj legislativi i postupcima za koje su odgovorni Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

u svojstvu nositelja provođeni su i drugi projekti financirani iz ERASMUS+ programa kao i iz drugih izvoda poput Zagrebačke upanije, Agencije za elektroničke medije, Mreže za ruralni razvoj i sl. Pandemija je nepovoljno utjecala na provedbu već ugovorenih projekata kao i na Ugovaranje prijavljenih obzirom da je intencija da se sva sredstva preusmjere u spašavanje gospodarstva te zdravstvo, a i ograničavajuće odredbe Stožera civilne zaštite onemogućuju provedbu projektiranih aktivnosti.

#### 4. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Prema LRS najvažnije ciljane skupine su nositelji poljoprivrednih gospodarstava i jedinice lokalne samouprave na području pod LAG obuhvatom.

U smislu provedbe operacija LRS krajnji korisnici tijekom provedbe projekta / LRS su:

- ruralno stanovništvo područja LAG-a
- poljoprivrednici
- mлади
- udruge civilnog društva
- Jedinice lokalne samouprave

Kako bi ciljane skupine bile što više uključene u realizaciju Projekta, kontinuirano su provođeni različiti oblici informiranja i konzultacija na LAG području te razne aktivnosti usmjerene na promociju LRS s aktivnostima provedbe LRS. Korišteni su različiti promotivni alati i aktivnosti, a uključuju:

- Radionice – predstavljanje LRS i mogućnosti financiranja putem LRS, edukacije poljoprivrednika, savjetovanje za LAG natječaje
- Individualni konzultacijski sastanci i savjetovanja daljinskim putem (telefon, e-mail)
- Baza projektnih ideja dionika LAG područja
- Komunikacioni kanali LAG-a: objave na web stranici, FB stranici; Agroklubu
- Predstavljanje provedbe LRS partnerstvu odnosno Skupštini LAG-a
- Konzultacijski procesi za izmjene LRS – anketni upitnici, daljinske individualne konzultacije, radionice i sastanci tijela partnerstva (Upravni odbor i Skupština)
- Informiranje o mjerama iz Programa ruralnog razvoja te ostalim natječajima iz sredstava EU fondova i proračunskih sredstava
- Medijske objave

- Objave na stranicama JLS na području LAG-a
- Uredovni dani izvan sjedišta LAG-a: U Stupniku, Klinča Selu i Samoboru (do 2019.), u Jastrebarskom i Svetoj Nedelji (u tijeku)
- Omogućavanje održavanja uredovnih dana Ministarstva poljoprivrede (Savjetodavne službe) u prostoru LAG-a čime najlakše i najbrže dopiremo do potencijalnih korisnika te iz prve ruke imamo uvid u problematiku te potrebe poljoprivrednika

## 5. PROCJENA LIUDSKIH KAPACITETA LAG-a SAVA

Ljudski kapaciteti LAG-a uključuju zaposlenike LAG-a koji čine Stručnu službu LAG-a, partnerstvo LAG-a koje uključuje članove LAG-a i njihove predstavnike u Skupštini LAG-a, Upravni i Nadzorni odbor LAG-a te volontere LAG-a.

Na početku provedbe LRS LAG-a SAVA 2014-2020, sjedište i ured LAG-a nalazio se u Zaprešiću na adresu Zelengaj 15 u sklopu komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. U svibnju 2018. godine, zbog povećanja efikasnosti rada Stručne službe te bolje fizičke dostupnosti dionicima (na ograničavajuće vrijeme dolazaka i mogućnosti korištenja prostora unutar zgrade komunalnog poduzeća), LAG SAVA seli ured na drugu adresu, u centar Grada Zaprešića na adresu bana Josipa Jelačića 48. Novi uredski prostori omogućili su veću slobodu u osmišljavanju raznih aktivnosti te fleksibilnost u radnom vrmenu čime se maksimalno pogodovalo potencijalnim korisnicima. U novim uredima osim uredskih prostorija uz sufinanciranje Zagrebačke županije uređena je i predavaonica u kojoj se održavaju radionice i predavanja. Osim LAG-a prostor za održavanje radionica redovito koriste i djelatnici Ministarstva za održavanje stručnih radionica. Sve ove aktivnosti, naročito u pogledu predavanja i radionica uvelike su pripomogle kod animacije poljoprivrednika.

Na 31. prosinca 2020.g. partnerstvo, odnosno Skupštinu LAG-a čini 45 članova, i to 11 jedinica lokalne samouprave, 6 pripadnika javne interesne skupine (osim JLS), 17 pripadnika gospodarske interesne skupine i 11 pripadnika civilne interesne skupine.

Upravljačko tijelo LAG-a je Upravni odbor koji se sastoji od 1 članova partnerstva, a koji je u sklopu svojih zadaća zadužen za odabire projekata dionika u provedbi operacija LRS (LAG natječaji). Zadaće Upravnog odbora definirane su Statutom LAG-a.

Skupština i Upravni odbor održavali su redovite sjednice, od kojih su neke bile i elektronske. Također, Upravni odbor je u razmatranom periodu jednoglasno donosio Odluke o odabiru projekata u provedbi LRS LAG SAVA 2014-2020.

Nadzorni odbor kao kontrolno tijelo i tijelo za prigovore u razmatranom periodu se nije sastajao jer nije bilo potrebe, odnosno zahtjeva koji bi se morali razmatrati na ovom tijelu LAG-a.

U odnosu na početak provedbe Projekta smanjen je broj članova Skupštine za 59 članova (razlog su većinom bila isključenja članova od strane Skupštine radi neaktivnosti, tj. Neodlaska na sjednice Skupštine čime su se stvarali problemi s zadovoljavanjem postotaka prisutnosti određene interesne skupine te zanonitosti donesenih Odluka), a broj članova Upravnog odbora je ostao je nepromjenjen. Sa stanovišta operativnosti pokazalo se ispravnim smanjiti broj članova Skupštine, ali je i dalje ispoštivana odredba o jednakoj zastupljenosti predstavnika sva tri sektora (javni, poslovni i civilni sektor).

Činjenica je da je jednostavnije sakupiti kvorum i održati pravovaljane sjednice Skupštine kad je manji broj njenih članova, ali bilo bi jako dobro povećati broj članova Skupštine kako bi područje LAG-a bilo ravnomjerno pokriveno članovima partnerstva.

Na početku provedbe Projekta članovi Skupštine LAG-a SAVA imaju uspostavljen međusobni partnerski odnos te donošenje odluka na LAG razini realno odražava temeljno načelo LEADER pristupa donošenja odluka „odozdo prema gore“, s ravnomjerno zastupljenim interesnim skupinama u procesu donošenja odluka. Tijekom provedbe Projekta, a zbog pravila provedbe LEADER-CLLD mjere unutar Programa ruralnog razvoja RHH 2014-2020, partnerstvo je većim dijelom bilo usmjereno na zadovoljavanje i formalno poštivanje pravila provedbe PRR i zakonodavstva poslovanja udrug, umjesto dalnjeg razvijanja međusobnih partnerskih odnosa i projekata. Iz istog razloga je onemogućeno aktivno sudjelovanje u razvoju operacija LRS koji bi bile u potpunosti prilagođene razvojnim potrebama LAG područja.

Potrebno je dalje razvijati i jačati međusobne veze između članova partnerstva (Skupština LAG-a) te potaknuti razvoj partnerskih projekata između članova Skupštine LAG-a ali i ostalih dionika LAG područja.

Na početku provedbe Projekta Stručna služba LAG-a je brojila 3 zaposlene osobe zaposlene na provedbi LRS LAG-a. Broj zaposlenika na provedbi LRS u prosincu 2016. g. izražen u ekvivalentu punog radnog vremena, odnosno FTE = 3.

Kapaciteti Stručne službe LAG-a koji rade na provedbi projekta (LRS), u evaluacijskom razdoblju provedbe na razini cijele godine, iznose:

- 2017. g. – 2,4 FTE
- 2018. g. – 1,9 FTE
- 2019. g. – 1,9 FTE
- 2020. g.- 3 FTE

Broj zaposlenih u LAG-u na dan 31. prosinac 2020. je 3 osobe, od toga sve 3 na puno radno vrijeme s time da jedna kolegica koristi porodiljni dopust.

Tijekom evaluacijskog razdoblja u LAG-u su kroz Mjere HZZ-a (Mladi za EU te Stručno ospozobljavanje za rad bez zasnicanja radnog odnosa) radila tri zaposlenika. Jedna zaposlenica u LAG-u radi i dalje te je s njom sklopljen Ugovor na neodređeno vrijeme. Jedan zaposlenik nakon korištenja mjere radio je u LAG-u no nakon završetka Ugovora na određeno on nije produljen, dok je jedna zaposlenica samostalno podijela Otkaz Ugovora o radu određeno vrijeme.

Voditeljica LAG-a zaposlena je u LAG-u 2016. godine te je na ovoj poziciji cijelo vrijeme provedbe LRS uz izbivanje u šestomjesečnom razdoblju radi korištenja porodiljnog dopusta kao i stručna suradnica koja je nastavila rad u LAG-u nakon završetka Stručnog ospozobljavanja. Treća djelatnica na provedbu LRS-a uključila se nakoan provedbe ESF projekta JC SAVA.

Voditeljica i stručna suradnica agronomiske su struke s završenim studijima ekološke poljoprivrede i agroturizma (voditeljica) te hortikulture (stručna suradnica).

Stučna suradnica koja na projektu provedbe LRS radi od 2020. g profesorica je hrvatskog jezika i indologije s bogatim iskustvom naričito u segmentu obrazovanja te svojim znanjem i iskustvom uvelike doprinosi provedbi LRS.

Od 2018. godine LAG je raspisao ukupno 6 Natječaja iz LRS. Ponovljeni su Natječaji za male poljoprivrednike te Natječaj za JLS-ove.

Također su ispoštivane sve zakonske obveze te obveze prema Ministarstvu poljoprivrede i APPRRR-u koje proizlaze iz potpisanih Ugovora i Sporazuma.

Rad ureda se snažno oslanja na korištenje IT tehnologije te je sva dokumentacija Udruge pohranjena u uredu u paprinatom obliku i u cloud on-line sustavu što omogućava uredsko

poslovanje u dislociranim uredima i poslovanje od kuće. Postojeća uredska oprema omogućuje ovaj način fukncioniranja te kao i ostala uredska oprema (printeri, scaner, projektor, uredski namještaj) zadovoljava potrebe sadašnjeg obujma poslovanja, kao i poslovni prostori kojima se LAG koristi.

U evaluacijskom razdoblju zaposlenici LAG-a, te pojedini članovi partnerstva i volonteri, educirani su putem različitih radionica i edukacija o: LEADER-CLLD metodologiji uključujući monitoring i evaluaciju LRS, poslovanju i finansijskom upravljanju udruga, metodama provedbe različitih operacija LRS, provedbi pojedinih operacija PRR RH, Pripremi i provedbi EU projektat, Javnoj nabavi, primjeni legislative različitih tematskih područja a vezano uz rad LAG-a i provedbu LRS (uredsko poslovanje, javna nabava, GDPR i dr.), financiranju projekata putem drugih fondova i programa EU, crowdfunding-u i ostalim temama važnim za redovito poslovanje LAG-a.

S obzirom na zadaće LAG-a, potrebe dionika LAG područja te potrebe organizacije za provedbom projekata i šire od provedbe same LRS LAG-a u sklopu Programa ruralnog razvoja, potrebno je jačati ljudske kapacitete LAG-a, prvenstveno omogućavanjem otvaranja dodatnih radnih mesta, daljnjom edukacijom zaposlenika, članova partnerstva i volontera, kao i pružanjem dodatnih prilika za volontiranje u LAG-u za mlade te nezaposlene osobe na LAG području.

U radu LAG-a kroz volonterski angažman od početka sudjeluju brojni volonteri od kojih su najvažniji članovi Upravnog odbora. Ostali volonteri uključuju se u rad LAG-a ovisno o njihovim afinitetima i mogućnostima.

LAG SAVA do sada je najmanje surađivao s civilnim sektorom, što je dijelom splet okolnosti, a dijelom proizlazi da tipovi operacija za koje su do sada otvarani natječaji nisu bili prvenstveno namijenjeni civilnom sektoru. Najznačajnije organizacije s kojima LAG surađuje je LEADER mreža Hrvatske.

Što se tiče suradnje s ostalim LAG-ovima kroz brojne neformalne kanale osigurana je kontinuirana suradnja i podrška sa susjednim LAG-ovima; Zagorje Sutla, Prizag, Mura-Drava, Međimurski doli i bregi, Sjeverozapad i Izvor čime se osigurava bolja efikasnost te brže rješavanje problema i raznih nepredvidljivih situacija s kojima se gotovo svakodnevno susrećemo u svom radu.

## 6. METODE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

U evaluacijskom razdoblju projektom, odnosno provedbom LRS upravljalo se na razini partnerstva odnosno Skupštine i Upravnog odbora LAG-a, te na razini Stručne službe LAG-a.

Glavne aktivnosti LAG-a uključuju:

- Održavanje redovitih sastanaka partnerstva i stručne službe – za planiranje, organizaciju, koordinaciju i praćenje stanja provedbe LRS i njenih operacija te tekućeg rada LAG-a
- Pripremu i provedbu LAG natječaja
- Izradu godišnjih akcijskih i finansijskih planova, koje usvaja Skupština
- Izradu godišnjih izvješća o radu i godišnjih finansijskih izvješća, koje usvaja Skupština
- Praćenje provedbe LRS – interni alati i tablice Stručne službe: postizanje vrijednosti indikatora rezultata; usporedba ostvarenog i planiranog
- Izrada izmjena LRS od strane Stručne službe LAG-a – ispitivanje stanja na području LAG-a, prilagodba LRS u odnosu na dostignute rezultate i planirane indikatore, provedbenu legislativu te aktualno stanje na terenu tijekom provedbe
- Provedba animacijskih aktivnosti za dionike – praćenje provedbe te prilagodba potrebnih aktivnosti sukladno potrebama dionika, ali i kapacitetima ljudskih resursa LAG-a te zahtjevima uspješne provedbe LRS.

U provedbi ovih aktivnosti LAG se koristio nizom metoda za različite vidove upravljanja projektom (upravljanje obuhvatom projekta, upravljanje procesima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje troškovima, upravljanje kvalitetom, projektnom komunikacijom, vremenom, rizikom i nabavom), kao i integracijskim upravljanjem koje objedinjuje sve navedene aspekte projekta. S obzirom na zahtjeve koji se postavljaju pred organizaciju njeni ljudski kapaciteti predstavljaju ograničavajući faktor u provedbi Projekta.

### 6.1. Metode projektnog upravljanja

U upravljanju projektom koristile su se metoda kontrole troškova, koja nije u 2018. godini osiguravala dovoljnu likvidnost za kontinuirano financiranje operativnog poslovanja zbog nedostatka sredstava za premoštenje perioda od šest mjeseci, koliko traje period povrata

kvartalnih troškova organizacije od strane APPRRR-a (predfinanciranje). Stoga su se u kontinuitetu koristile pozajmice Zadruge za etično financiranje iz 2016. godine koje su u potpunosti vraćene tek početkom 2019. godine.

Upravljanje ljudskim resursima Statutom je povjereni voditeljici LAG-a. U periodu koji je razmatran došlo je do povećanja plaća u svim sektorima pa tako i u LAG-u koji je u skladu s ograničenjima koja proizlaze iz Sporazuma s APPRRR-a te ograničenim sredstvima koja se prikupljaju iz članarina, osigurao prostor za povećanje plaća te ostalih materijalnih prava. Trenutno dvoje od troje zaposlenika ima ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme. U upravljanju ljudskim resursima koristile su se metode nagrađivanja kao i metoda obuke i razvoja.

## 6.2. Metode upravljanja kvalitetom

Upravljanje kvalitetom predstavlja u ovom Projektu najznačajniji aspekt upravljanja, jer konačni rezultat Projekta mora biti uspješno provedena LRS, ostvarne mjere za dostizanje ciljeva te postizanje mjerljivih rezultata i indikatora uspješnosti.

U upravljanju kvalitetom projekta koristila se metoda razvijanja partnerstva, posebice pri izmjeni najznačajnijih dokumenata organizacije (LRS, Statut) te objava natječaja za postizanje mjera odnosno ciljeva LRS.

Objava natječaja za različite tipove operacije te uspješna dodjela sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 je sama svrha LRS, ali i organizacije same. Ona obuhvaća niz koraka od pripreme natječajne dokumentacije (koju u najvećoj mjeri LAG zaprima gotovu od strane APPRRR-a), objave natječaja, ocjenjivanja u dva koraka, donošenja Odluka Upravnog odbora o odabiru projekata, unošenje dokumentacije u Agronet te kontrole namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika.

U cilju povećanja operativnosti u 2019. godini značajno je izmijenjen dotadašnji Statut organizacije te je Voditeljica imenovana osobom ovlaštenom za zastupanje te su joj Statutom dodjeljene određene ovlasti koje u velikom djelu pojednostavljaju i ubrzavaju sve djelatnosti LAG-a.

### *6.2.1. Izmjene Lokalne razvojne strategije*

Odobrena LRS LAG-a SAVA 2014-2020 izrađena je tijekom provedbe podmjere 19.1 Pripremna pomoć“ Programa ruralnog razvoja od strane Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije.S procesom izrade LRS započelo se 13.11.2015. kada je imenovan tim za izradu dok je ista Strategija usvojena 24.3.2016. na sjednici Skupštine.

Obzirom da je prvočitna LRS bila neporovediva u obliku u kojem je izrađena, izrađena je njena izmjena, a do kraja 2020. godine izrađene su ukupno 4 izmjene prvočitne LRS.

Izmjena LRS izrađena je u drugoj polovici 2017. godine te je usvojena na sjednici Skupštine od 18.12.2017., a odobrena od Agencije za plaćanja 11.1.2018Ovom izmjenom izrađen je u potpunosti novi dokument s pripadajućim prilozima i grafikama koji su bili sukladni uputama Ministarstva. Definirani su ciljevi i Mjere koje će se provoditi, Kriteriji odabira, bodovanje istih, definirana su Fokus područja i indikatori.

Izmjena LRS izrađena je u prvoj polovini 2018. godine te je usvojena na sjednici Skupštine od 16.5.2018. Izmjena je usvojena od strane APPRRR-a 4.7.2018. Izmjenom se povećala alokacija za dodjelu sredstava malim poljoprivrednicima na 1. LAG Natječaju kako bi potporu ostvarili svi

koji su zadovoljili uvjete prihvatljivosti te prešli bodovni prag. Kako bi se povećala alokacija za poljoprivrednike neznatno je smanjena potpora za JLS-ove (s 33.000 EUR-a na 30.000 EUR-a)

Izmjena LRS izrađena je polovicom 2019. godine te je usvojena 5.7.2019. godine. Izmjena je os strane APPRRR-a potvrđena 9.7.2019. godine. Izmjenom se u potpunosti iz LRS-a izbacila Mjera 8 jer za mjeru na nacionalnj razini nije bilo pretjerano interesa a isto tako u ovom trenu postalo je razvidno kako su iznimno malene šanse da APPRRR aktivira ovaj tip operacije. Izmjenom su se u TO 1.1.2 prealocirala sredstva koja su ostala neiskorištena unutar TO 1.1.1. (za male poljoprivrednike 15.000 EUR-a) kao i dio sredstava iz TO 2.1.1. (za JLS-ove) obzirom da se na natječaj za JLS-ove nije prijavio Grad Zaprešić a prijave Općine Pušća i Luka radi nedostatne dokumentacije odbijene su i nisu ostvarile financiranje.

Izmjena LRS izrađena je u drugoj polovici 2020. g. I usvojena je od strane Skupštine 2.9.2020..

Izmjena je potvrđena od strane APPRRR-a 25.9.2020. godine. Izmjeni Lrs pristupilo se nakon što je LAG\_u dodjećeno nagradnih 1.478.840,00 kn. Sva novodobivena sredstva kao i neutrošena sredstva iz ostalih Mjera alocirana su u TO 1.1.1 kako bi se otvorio novi Natječaj za male poljoprivrednike. Ovom izmjenom LRS planirano je još samo raspisivanje TO 1.2.1. tj mjere namjenjene razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti za koju je Natječaj otvoren krajem prosinca.

## 6.2.2. Ostali interni akti LAG-a

LAGSAVA je donio i niz internih akata koji ma je cilj osiguranje nesmetanog, zakonitog te transparentnog poslovanja.

Tablica 6. Popis internih akata

Donositelj	Akt	Svrha akta
Skupština LAG-a	Statut	Reguliranje procesnih radnji Skupštine,UO, Predsednika, Voditelja te svih ostalih djelatnosti Udruge
Skupština LAG-a	Pravilnik o materijalnom i finansijskom poslovanju LAG-a	Reguliranje materijalno- finansijskog poslovanja
Skupština LAG-a	Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave	Regulira interne procedure jednostavne nabave
Skupština LAG-a	Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka	Regulira zaštitu osobnih podataka
Skupština LAG-a	Pravilnik o sistematizaciji radnih mjeseta i zapošljavanju	Propisuje vrste i radnih mjeseta te opisuje njihove zadaće, te način zapošljavanja u Udruzi
Skupština LAG-a	Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a SAVA	Regulira postupovne radnje pri ocjenjivanju projektnih prijava
Skupština LAG-a	Odluka o visini članarine	Propisuje visinu članarine
UO LAG-a	Pravilnik o brojčanim oznakama	Regulira postupanje s dokumenatcijom u stručnoj službi LAG-a te označavanje tj. Urudžbiranje ulaznih i izlaznih dokumenata
Upravni odbor LAG-a	Poslovnik o radu Upravnog odbora	Reguliranje procesnih radnji Upravnog odbora
UO LAG-a	Odluka o pravima iz radnog odnosa	Propisuje prava zaposlenika koja proizlaze iz radnog odnosa

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Akti su bili donošeni na vrijeme te su pravodobno regulirali procese, postupke koji su se postavljali pred organizaciju.

Druga značajna metoda upravljanja kvalitetom je kontinuirano unaprjeđivanje, kojem služi i ova evaluacija.

Metoda kontinuiranog unaprjeđivanja koristila se i u unaprjeđenju operativnog poslovanja LAG-a (zaposlenici, financiranje, osiguranje poslovnog prostora).

#### 6.3. Metode diseminacije

Pri diseminaciji različitih informacija (o radu LAG-a, LRS, natječajima i sl) koristile su se različite metode. Metoda informacijskih bannera, letaka koristila se za informiranje opće javnosti o provedbi Projekta. Ovo su jednostavnii formati koji se ako čitaju i mogu osigurati širok krug diseminacije. Metode javne promocije koristile su se kroz logo organizacije, IT tehnologije: e-mail, objave na web stranici LAG-a te FB stranici, elektronički bilten, objave u tiskanim medijima, radio i TV, a namijenjene su bile ciljanim skupinama te krajnjim korisnicima. Metode promotivnih materijala s logom organizacije koristila se za povećanje vidljivosti u općoj javnosti. Na kraju 2020. godine nedostaju promotivni materijali (letci i dr.) te je potrebno iste ponovno nabavljati ili koristiti više ostale metode diseminacije.

S obzirom na kraj razdoblja Projekta, ograničenje finansijskih sredstava te potrebu detektiranja i procjene potreba za iduće programsko razdoblje organizacija će koristiti više metode individualnog savjetovanja, radionica na terenu, objava na FB stranici i web stranici LAG-a te će ukoliko iznađe dovoljno finansijskih sredstava financirati uređenje web stranice LAG-a.

#### 6.4. Ostale metode

Metode ublažavanja rizika nisu korištene.

Od metoda vremenskog upravljanja projektom koristila se metoda pojednostavljenog gantograma za kvartalna planiranja dok su se finacije planirale putem cash flow tablica.

## **7. CILJEVI, MJERE LRS LAG-a SAVA2014-2020, TE OSTVARENI REZULTATI I INDIKATORI**

Da bi se mogla napraviti evaluacija Projekta u razmatranom periodu potrebno je najprije izvršiti kratak rezime dosadašnje provedbe Projekta (monitoring).

### **7.1. SC1 Razvoj konkuretnе poljoprivrede na području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma**

#### M 1.1 – Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava

Putem ove Mjere i pratećih tipova operacija (TO 1.1.1. i TO 1.1.2.) za njezinu provedbu LAG će sufinancirati ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i nepoljoprivrednu djelatnost kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost PG-a, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja se odnose na sve poljoprivredne sektore, no prednost imaju ulaganja na područjima koja imaju teže uvijete za razvoj sukladno kategorizaciji naselja unutar LRS LAG-a, ulaganja u ekološku poljoprivredu te ulaganja koja provode mlađi i obrazovani tj. poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi.

#### M 1.2 – Potpora razvoju diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a

U okviru ove mјere, potpore će se odobravati za ulaganja u razvoj diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a. Kao i u svim tipovima operacija prednost ostvaruju projekti koji se provode na područjima koja imaju teže uvijete za razvoj sukladno kategorizaciji naselja unutar LRS LAG-a, projekti kojima će se očuvati ili stvoriti nova radna mjesta te projekti kojima se ulaže u turizam, preradu i izravnu prodaju.

#### Očekivani rezultati provedbe u programskom razdoblju:

- Povećanje broja projekata sufinanciranih iz javnih sredstava PRR 2014.-2020. za 50 projekta
- Povećanje broja gospodarstava koji dobivaju potporu zarazvoj malih poljoprivrednih gospodarstava za 31 gospodarstava

Tablica 7: Krovni pokazatelji (result indicators) za SC1:

		Raspisano	Postotak raspisanih sredstava od ukupnog iznosa	Postotak raspisanih sredstava od -19.2.	Izdane Odluke LAG	Postotak iznosa izdanih Odluka od ukupnog iznosa	Postotak iznosa izdanih Odluka -19.2.	Izdane Odluke APPRRR-a	Postotak iznosa izdanih Odluka APPRRR-a od ukupnog iznosa	Postotak iznosa izdanih Odluka APPRRR-a od 19.2.	Isplaćeno (sukladno izvješću APPRRR-a na dan 22.10.2020)	Postotak isplaćenih projekata od ukupnog iznosa	Postotak isplaćenih projekata-19.2.	
SC 1	M 1.1	TO 1.1.1.-Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	3.433.564,50 kn	31,72%	39,92%	3.370.092,00 kn	31,13%	39,19%	1.563.492,00 kn	14,44%	18,18%	1.395.975,00 kn	12,90%	16,23%
		TO 1.1.2-Potpri razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava	2.072.428,04 kn	19,14%	24,10%	2.072.428,04 kn	19,14%	24,10%	2.069.623,04 kn	19,12%	24,07%	- kn	0%	0,00%
	M 1.2.	TO 1.2.1.-Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma	1.091.864,63 kn	10,09%	12,70%	- kn	0,00%	0,00%	- kn	0,00%	0,00%	- kn	0%	0,00%
		UKUPNO SC 1	6.597.857,17 kn	60,95%	76,72%	5.442.520,04 kn	50,28%	63,28%	3.633.115,04 kn	33,56%	42,25%	1.395.975,00 kn	12,90%	16,23%

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 8: broj izdanih odluka unutar SC1

SC/M/TO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ukupno izdanih Odluka od strane LAG-a	Ukupno potvrđenih projekata od strane APPRRR-a	Ciljana vrijednost 2023
SC1	N/A[1]	N/A	N/A	0	14	12	16	42	26	50
M1.1	N/A	N/A	N/A	0	14	12	16	42	26	43
TO1.1.1	N/A	N/A	N/A		14		16	30	14	31
TO1.1.2	N/A	N/A	N/A			12		12	12	12
M1.2	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	7
TO1.2.1	N/A	N/A	N/A			0		0	0	0
TO1.2.2	N/A	N/A	N/A				0	0	0	7

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Pojašnjenje:

LAG SAVA u prosincu 2020. godine izdao je Odluke o odabiru za TO 1.1.1. koje će nakon pravomoćnosti u toku siječnja biti unešene u AGRONET kako bi išle na odobrenje od strane APPRRR-a.

Natječaj za TO 1.2.1. raspisan je krajem prosinca te će rezultati biti u prvoj polovici 2021.

Sukladno vrednovanju provedbe ukupne LRS putem krovnih pokazatelja za SC 1 LAG je odredio iznos od 6.597.857,17 HRK što je 60,95% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2. tj 76,72% od ukupno dodjelenog iznosa koji iznosi 10.825.417,85 HRK. Sukladno LRS planirano je dodjeljivanje ukupno 50 projekata unutar ovog cilja.

LAG je raspisao Natječaje za dodjelu svih sredstava unutar SC1 , Izdano je Odluka u vrijednosti 5.442.520,04 kn od strane LAG-a dok je od strane APPRRR-a potvrđeno projekata u iznosu 3.633.115,04 kn a na 22.10.2020. (kada je zaprimljeno izvješće APPRRR-a) isplaćeno je 1.395.975,00 kn što su sve projekti odabrani na 1. Natječaju za male poljoprivrednike iz 2018. godine.

Važno je naglasiti da je za provedbu LRS operacija dokumentaciju za LAG natječaje pripremala Agencija za plaćanja te da je kontrola projektnih prijava slijedila opsežnost kontrola na nacionalnom nivou, bez obzira što je za dio operacija iznos potpore značajno manji (npr. projekti javne infrastrukture). Dodatno, kontrole prijava projekata odvijaju se i na LAG razini i na razini Agencije za plaćanja, što korisnicima produžuje vrijeme čekanja za odluke o financiranju na LAG natječajima u odnosu na vrijeme potrebno za odobrenja na nacionalnim natječajima. Navedeno dovodi do slabljenja povjerenja naspram LAG-ova i nezadovoljstva načinom na koji se provodi

LEADER odnosno odobrena LRS.

#### 7.1.1. TO 1.1.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

- Objavljeni broj natječaja: 2
- Broj odabralih projekata od strane LAG-a: 30
- Broj potvrđenih projekata od strane AP: 14
- Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 11
- Ukupni iznos dodijeljenih sredstava (konačno): 3.370.092,00 HRK
- Ukupni iznos isplaćenih sredstava: 1.395.975,00 HRK

Tablica 9: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 1.1.1.:

	to 1.1.1 -1. natječaj		to 1.1.1 -2. natječaj	
sektor	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos
voćarstvo	7	781.746,00 kn	3	338.737,50 kn
vinogradarstvo	3	335.034,00 kn	3	338.737,50 kn
povrćarstvo	1	111.678,00 kn	1	112.912,50 kn
cvjećarstvo	1	111.678,00 kn	1	112.912,50 kn
pčelarstvo	1	111.678,00 kn	1	112.912,50 kn
stočarstvo	1	111.678,00 kn	2	225.825,00 kn
ratarstvo	0	- kn	4	451.650,00 kn
aromatično i ljekovito bilje	0	- kn	1	112.912,50 kn
javna infrastruktura	0	- kn	0	- kn
ukupno	14	1.563.492,00 kn	16	1.806.600,00 kn
tip ulaganja	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos
mehanizacija	6	670.068,00 kn	12	1.354.950,00 kn
oprema	3	335.034,00 kn	4	451.648,00kn
trajni nasadi	5	558.390,00 kn	0	
Kombinacija <sup>8</sup>	4		0	
građenje	0	- kn	0	
ukupno		1.563.492,00 kn		1.806.600,00 kn
nositelj projekta	broj projekata	iznos	br. projekata	iznos
mladi (do 41. g)	8	893.424,00 kn	11	1.242.037,50 kn
žene	4	446.712,00 kn	2	225.825,00 kn
ekološka poljoprivreda	broj projekata	iznos	br. projekata	iznos
eko proizvodnja	2	223.356,00 kn	1	112.912,50 kn
radno iskustvo/obrazovanje	broj projekata	iznos	broj projekata	iznos
radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž)	2	223.356,00 kn	1	112.912,50 kn
tečaj min 120 sat	3	335.034,00 kn	2	225.825,00 kn
srednja škola	4	446.712,00 kn	5	564.562,50 kn
fakultet	4	446.712,00 kn	8	903.300,00 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020.

<sup>8</sup> Kod kombinacije projekta, projekt je ubrojen u kategoriju na koju se odnosila većina utrošenih sredstava


Razrada dodjeljenih sredstava iz TO 1.1.1. prema JLS te ukupnih iznosa projekata prema JLS u sklopu LAG-a SAVA

Tablica 10: Ukupni iznos dodjeljenih sredstava iz TO 1.1.1. po JLS

Ukupni iznos dodijeljenih sredstava po JLS			
	1. Natječaj	2. Natječaj	Ukupno
Brdovec	- kn	112.912,50 kn	112.912,50 kn
Dubravica	111.678,00 kn	112.912,50 kn	224.590,50 kn
Jastrebarsko	446.712,00 kn	338.737,50 kn	785.449,50 kn
Klinča Sela	111.678,00 kn	- kn	111.678,00 kn
Luka	- kn	225.825,00 kn	225.825,00 kn
Marija Gorica	223.356,00 kn	- kn	223.356,00 kn
Pušća	- kn	112.912,50 kn	112.912,50 kn
Samobor	- kn	338.737,50 kn	338.737,50 kn
Stupnik	- kn	225.825,00 kn	225.825,00 kn
Sveta Nedjelja	335.034,00 kn	112.912,50 kn	447.946,50 kn
Zaprešić	335.034,00 kn	225.825,00 kn	560.859,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>1.563.492,00 kn</b>	<b>1.806.600,00 kn</b>	<b>3.370.092,00 kn</b>

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 1: Ukupni iznos dodijeljenih sredstava iz TO 1.1.1. po JLS

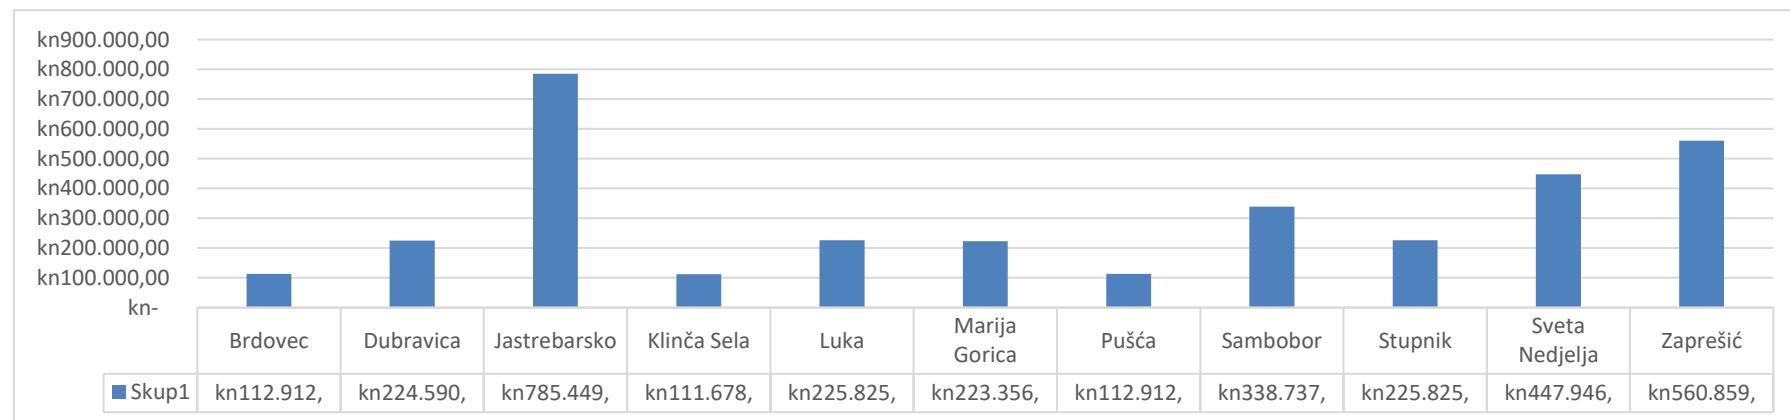

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 11: Ukupni iznos projekata financiranih kroz TO 1.1.1. po JLS

Ukupni iznos projekta tj. ulaganja u pojedinu JLS			
	1. Natječaj	2 Natječaj	Ukupno
Brdovec	- kn	115.000,00 kn	115.000,00 kn
Dubravica	121.000,00 kn	129.000,00 kn	250.000,00 kn
Jastrebarsko	488.165,75 kn	351.140,80 kn	839.306,55 kn
Klinča Sela	205.463,00 kn	- kn	205.463,00 kn
Luka	- kn	226.500,00 kn	226.500,00 kn
Marija Gorica	232.450,00 kn	- kn	232.450,00 kn
Pušča	- kn	113.000,00 kn	113.000,00 kn
Samobor	- kn	409.000,00 kn	409.000,00 kn
Stupnik	- kn	232.000,00 kn	232.000,00 kn
Sveta Nedjelja	350.875,00 kn	117.596,25 kn	468.471,25 kn
Zaprešić	341.083,25 kn	228.000,00 kn	569.083,25 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>1.739.037,00 kn</b>	<b>1.921.237,05 kn</b>	<b>3.660.274,05 kn</b>

Izvor: Stručna služba LAG-a, prosinac 2020

Graf 2: Ukupni iznos projekata financiranih kroz TO 1.1.1. po JLS



Izvor: Stručna služba LAG-a, prosinac 2020.

7.1.2. TO 1.1.2. "Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava"

- Objavljeni broj natječaja: 1
- Broj odabralih projekata od strane LAG-a: 12
- Broj potvrđenih projekata od strane AP: 12
- Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 0
- Ukupni iznos dodijeljenih sredstava (konačno): 2.069.623,04 HRK (LAG-ovim Odlukama dodjeljeni iznos je 2.072.428,04 no APPRRR je odobrio 2.069.623,04 HRK-izbijen je trošak ugradnje opreme u jednom projektu)
- Ukupni iznos isplaćenih sredstava: 0 HRK

Tablica 12: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 1.1.2.:

TO 1.1.2.		
SEKTOR	BR. PROJEKATA	IZNOS
Voćarstvo	2	316.875,00 kn
Vinogradarstvo	2	430.275,00 kn
Povrćarstvo	1	120.000,00 kn
Cvjećarstvo	1	194.077,93 kn
Pčelarstvo		
Stočarstvo	6	1.011.200,11 kn
Ratarstvo		
Aromatično i ljekovito bilje		
Javna infrastruktura		
<b>UKUPNO</b>	<b>12</b>	<b>2.072.428,04 kn</b>
TIP ULAGANJA	BR. PROJEKATA	IZNOS
Mehanizacija	10	1.655.975,11 kn
Oprema		
Trajni nasadi	2	416.452,93 kn
Kombinacija		
Građenje		
<b>UKUPNO</b>	<b>12</b>	<b>2.072.428,04 kn</b>
NOSITELJ PROJEKTA	BR. PROJEKATA	IZNOS
Mladi (do 41. g.)	6	1.026.227,93 kn
Žene	2	214.500,00 kn
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA	BR. PROJEKATA	IZNOS
EKO proizvodnja	3	436.875,00 kn
Radno iskustvo/obrazovanje	BR. PROJEKATA	IZNOS
Radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž)	2	387.375,00 kn
Tečaj min 120 sat	4	846.727,93 kn
Srednja škola		
Fakultet	1	222.375,00 kn


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020.

Tablica 13: Dodijeljena sredstva unutar TO 1.1.2 po JLS

Dodijeljeno	
Brdovec	165.000,00 kn
Dubravica	307.375,00 kn
Jastrebarsko	659.250,00 kn
Klinča Sela	- kn
Luka	91.270,11 kn
Marija Gorica	207.900,00 kn
Pušća	222.375,00 kn
Samobor	222.375,00 kn
Stupnik	- kn
Sveta Nedjelja	- kn
Zaprešić	194.077,93 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>2.069.623,04 kn</b>

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 3: Dodijeljena sredstva unutar TO 1.1.2 po JLS

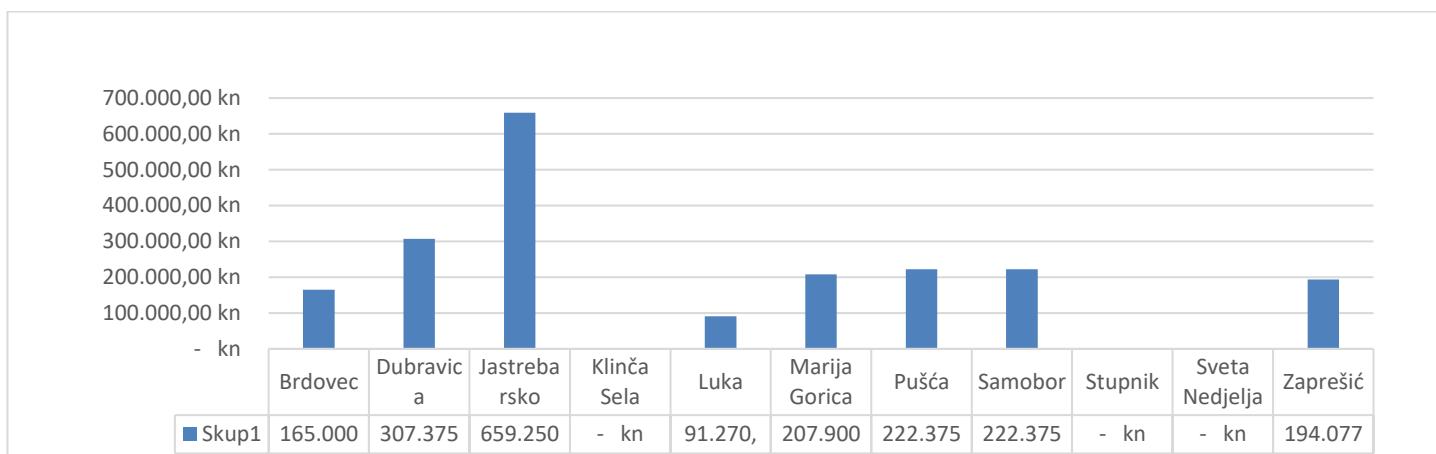


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 14: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.1.2 po JLS

Ukupni iznos projekta tj. ulaganja u pojedinu JLS	
Brdovec	330.000,00 kn
Dubravica	650.140,00 kn
Jastrebarsko	1.139.000,00 kn
Klinča Sela	- kn
Luka	189.461,00 kn
Marija Gorica	297.000,00 kn
Pušća	490.000,00 kn
Samobor	360.500,00 kn
Stupnik	- kn
Sveta Nedjelja	- kn
Zaprešić	277.254,19 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>3.733.355,19 kn</b>

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 4: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.1.2 po JLS

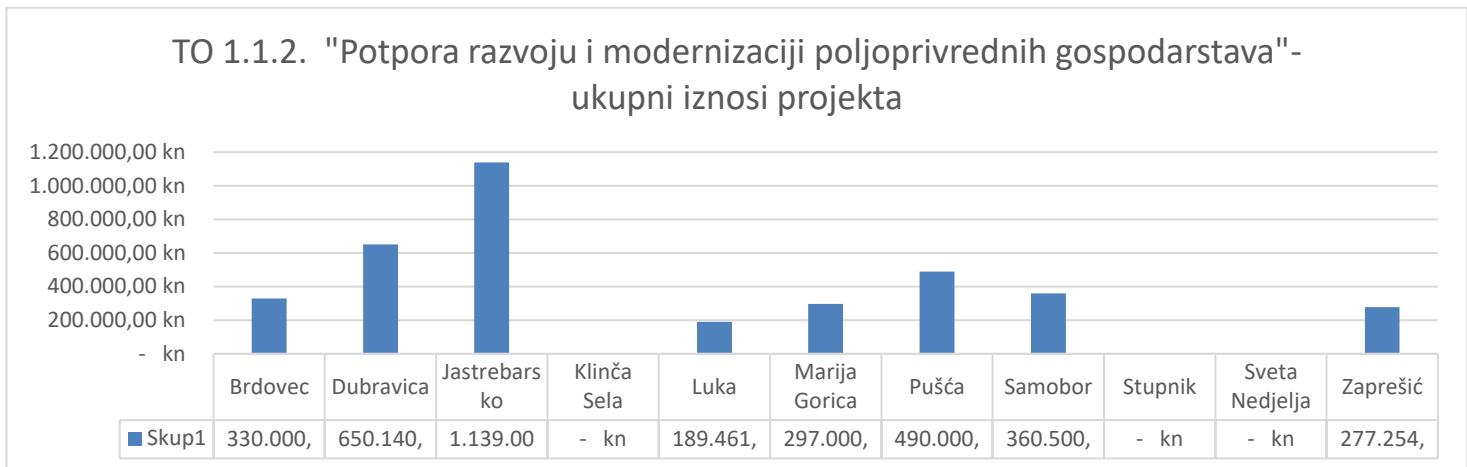

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

#### *7.1.3. TO 1.2.1 „Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma“*

- Objavljeni broj natječaja: 1
- Broj odabralih projekata od strane LAG-a: 0
- Broj potvrđenih projekata od strane AP: 0
- Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 0
- Ukupni iznos dodijeljenih sredstava (konačno): 0 HRK
- Ukupni iznos isplaćenih sredstava: 0 HRK

Natječaj za TO 1.2.1. objavljen je krajem prosinca 2020. g. (Usvojen od strane UO 23. prosinca 2020.), objavljen na web-u LAG-a SAVA 28. prosinca i u toku 2020. natječaj je tek u najavi dok će prijave biti omogućene od 1. veljače do 8. ožujka 2021.

#### *7.2. SC 2 - Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinegrijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a*

##### M 2.1 – Potpora razvoju javne društvene infrastrukture

Cilj provedbe operacija u okviru ove mjere je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnog potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomski održivosti. Ulaganja putem ove mjere imaju za cilj ublažiti nedostatak pristupa uslugama i infrastrukturi, s naglaskom na sadržaje namjenjen djeci predškolskog uzrasta.

##### M 2.2 – Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a

Cilj ove mjere je i suradnja između LAG-ova i njihovih razvojnih dionika putem projekata suradnje na

nacionalnoj razini. Ciljevi suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža

Kako LAG predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji zajednički rade na poboljšanju uvjeta života na području LAG-a, uz provedbu podmjera 19.2 i 19.3, uloga LAG-a je i organizacija animacijskih i informacijskih aktivnosti uz poticanje cjeloživotnog učenja dionika. Cilj ove mjere je i pružiti potporu svim dionicima lokalne zajednice za sudjelovanje i doprinos lokalnom razvoju kroz razmjenu iskustava, pomoći pri pripremi projekata i slične aktivnosti. Članove LAG-a i zaposlenike LAG-a potrebno je dodatno usavršavati kako bi mogli djelovati kao motivatori u zajednici, te osmišljavati kvalitetne odgovore na potrebe zajednice. Svojim aktivnostima, lokalno razvojno partnerstvo povećati će vrednovanje djelovanja civilnog i gospodarskog sektora u zajedničkoj razmjeni znanja i informacija te razvoju međusobne suradnje.

#### Očekivani rezultati provedbe u programskom razdoblju:

- Povećanje broja projekata sufinanciranih iz fondova EU (EFPRR/PRR 2014.-2020.) za 10 projekata.
- Razvoj kvalitete života stanovnika područja LAG-a temeljen na poboljšanju usluga / razvoju društvene infrastrukture, povećanje populacije obuhvaćene unaprijeđenim uslugama / infrastrukturom za 15%
- Jačanje veza između različitih razvojnih dionika ruralnih područja razvojem implementacijom projekata suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini putem 1 projekta suradnje.
- Provedba 15 animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima na kojima će sudjelovati 150 sudionika.
- Provedba 6 animacijske aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta na kojima će sudjelovati 60 sudionika.
- Organizirane 4 aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina na kojima će sudjelovati 40 osoba.
- Organizirano 10 animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima na kojima će sudjelovati 100 osoba.

Tablica 15: Krovni pokazatelji (result indicators) za SC2

			Raspisano	Postotak raspisanih sredstava od ukupnog iznosa	Postotak raspisa nih sredstava - 19.2.	Izdane Odluke LAG	Postotak iznosa izdanih Odluka od ukupnog iznosa	Postotak iznosa izdanih Odluka -19.2.	Izdane Odluke APPRRR-a	Postotak iznosa izdanih Odluka APPRRR-a od ukupnog iznosa	Postotak iznosa izdanih Odluka APPRRR-a na dan 19.2.	Isplaćeno (sukladno izvješću APPRRR-a na dan 22.10.2020)	Postotak isplaćenih projekata od ukupnog iznosa	Postotak iznosa izdanih Odluka APPRRR-a 19.2.
SC 2	M2.1.	TO 2.1.1.- Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru	2.002.185,00 kn	18,50%	23,28 %	2.002.185,00 kn	18,50%	23,28%	2.002.185,00 kn	18,50%	23,28%	- kn	0%	0,00%
		UKUPNO SC2	2.002.185,00 kn	18,50%	23,28 %	2.002.185,00 kn	18,50%	23,28%	2.002.185,00 kn	18,50%	23,28%	- kn	0,00%	0,00%

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 16: broj izdanih odluka unutar SC2

SC/M/TO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ukupno izdanih Odluka od strane LAG-a	Ukupno potvrđenih projekata od strane APPRRR-a	Ciljana vrijednost 2023
SC2	N/A	N/A	N/A	0	8	1	1	10	10	10
M2.1	N/A	N/A	N/A	0	8		1	9	9	9
TO2.1.1	N/A	N/A	N/A		8		1	9	9	9
M2.2	N/A	N/A	N/A	0	0	1	0	1	1	1
TO2.2.1	N/A	N/A	N/A			1		1	1	1
TO2.2.2	N/A	N/A	N/A							

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

#### Pojašnjenje:

LAG SAVA u 2018. godini raspisao je Natječaj za TO 2.1.1. koji je sukladna TO 7.4.1. na nacionalnoj razini te je namjenjen ulaganju u javnu infrastrukturu. Iako je Strategijom bilo predviđeno kako će se dodijeliti 11 potpora (po 1 potpora u svaku JLS) u iznosu od 30.000,0 EUR-a, na Natječaj su zaprimljene prijave Općie Pušća i Luka koje su radi nedostatne dokumentacije odbačene te su izdane Odluke o odbijanju, dok Grad Zaprešić na Natječaj nije prijavio ni jedan projekt. Ponavljanjem Natječaja u 2020. godini sa smanjenom alokacijom obzirom da je dio sredstava prealociran za poljoprivrednike, dobivena je samo prijava projekta od strane Općine Pušća za koju je Odluku LAG-a potvrdio i APPRRR krajem 2020. godine. Općina Luka i Grad Zaprešić nisu aplicirali na Natječaj.

Tako je naposlijetku dodjeljeno 9 potpora putem ovog tipa operacije koji se unutar ovog SC-a financira iz Podmjere 19.2.

Unutar ovog cilja nalaze se i Podmjere 19.3. za koju je tek u drugoj poolovici 2020. godine zaprimljena Odluka o odobrenju od strane APPRRR-a, te Podmjera 19.4. koja se odnosi na tekuće troškove.

#### *7.2.1.TO 2.1.1. – Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru -u sklopu provedbe podmjere 19.2*

- Objavljeni broj natječaja: 2
- Broj odobrenih projekata od strane LAG-a: 9
- Broj potvrđenih projekata od strane AP: 9
- Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 0
- Ukupni iznos dodjeljenih sredstava: 2.002.185,00 HRK
- Ukupni iznos isplaćenih sredstava: 0 HRK

Tablica 17: Tablični prikaz odobrenih projekata To 2.1.1.

Sektor	TO 2.1.1.-1 Natječaj		TO 2.1.1.-2. Natječaj	
	Br. Projekata	iznos	Br. Projekata	iznos
Javna infrastruktura	8	1.779.000,00 kn	1	223.185,00 kn
Tip ulaganja	Br. Projekata	iznos	Br. Projekata	iznos
Oprema	4	889.500,00 kn		
Gradijanje	4	889.500,00 kn	1	223.185,00 kn


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 18: Dodjeljena sredstva unutar TO 2.1.1. po JLS

Dodijeljeno	
Brdovec	222.375,00 kn
Dubravica	222.375,00 kn
Jastrebarsko	222.375,00 kn
Klinča Sela	222.375,00 kn
Luka	0
Marija Gorica	222.375,00 kn
Pušća	223.185,00 kn
Samobor	222.375,00 kn
Stupnik	222.375,00 kn
Sveta Nedjelja	222.375,00 kn
Zaprešić	0
<b>UKUPNO</b>	<b>2.002.185,00 kn</b>

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 5: Dodjeljena sredstva unutar TO 2.1.1. po JLS

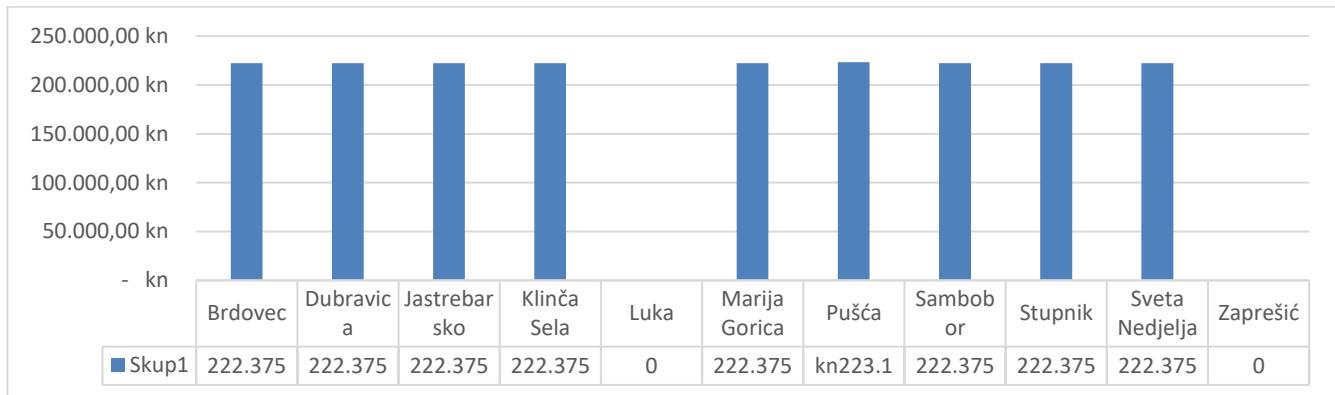


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 19: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 2.1.1. po JLS

Ukupni Iznos projekta	
Brdovec	317.722,50 kn
Dubravica	319.528,04 kn
Jastrebarsko	283.893,75 kn
Klinča Sela	305.359,75 kn
Luka	0
Marija Gorica	242.987,50 kn
Pušća	292.500,00 kn
Samobor	286.983,75 kn
Stupnik	624.850,00 kn
Sveta Nedjelja	663.750,00 kn
Zaprešić	0
<b>UKUPNO</b>	<b>3.337.575,29 kn</b>

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 6: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 2.1.1. po JLS

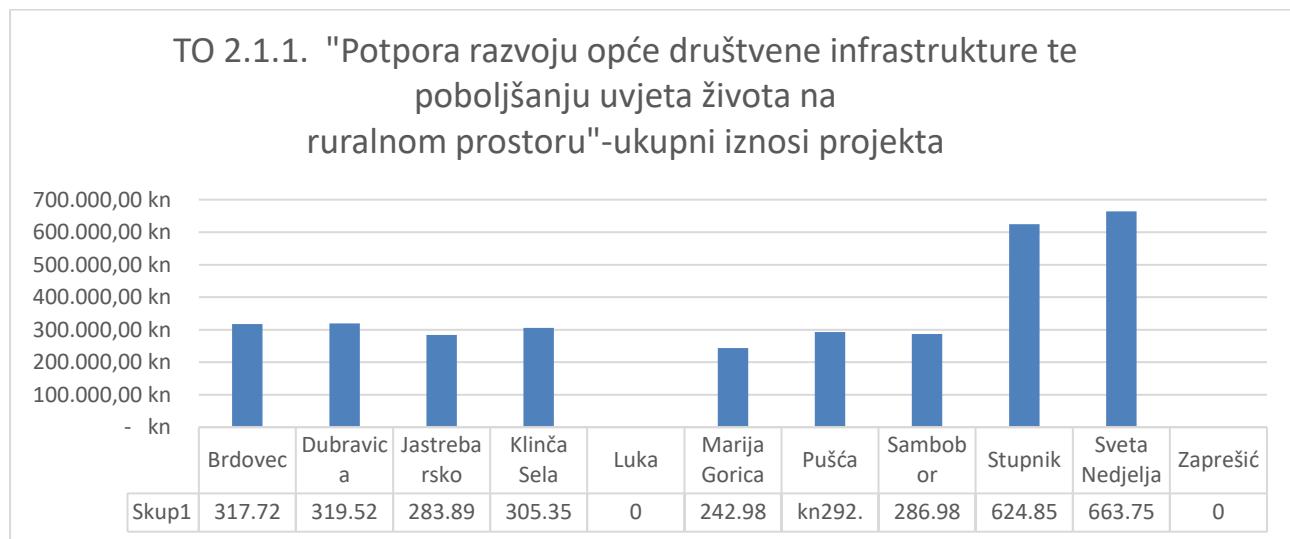

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

#### *7.2.2. TO. 2.2.1 – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a-u sklopu provedbe podmjere 19.3*

U evaluacijskom razdoblju proveden je dio pripremnih aktivnosti za provedbu podmjere 19.3. za jedan projekt suradnje s nacionalnim partnerima koji će se provoditi od 2020. do 2022. godine. Definirano je ciljano tematsko područje za projekat suradnje, što je i implementirano u izmjeni LRS.

##### Projekt suradnje "Skrivena blaga ruralnog turizma":

Projektom se plaira poticati inovacije u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske.

Specifični ciljevi su:

- Jačati kapacitete LAG-ova za kreiranje lokalnih strategija razvoja u području ruralnog turizma te osigurati prijenos znanja na lokalno stanovništvo i postojeće ekonomski subjekti.
- Promovirati lokalne destinacije korištenjem offline i online alata u svrhu inovativnog pristupa ruralnom turizmu te umrežiti destinacije u ruralnom području.
- Ojačati međusektorsku suradnju u području ruralnog turizma kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

Projekt u partnerstvu provode LAG-ovi s područja Hrvatskog zagorja, Prigorja i Međimurja u svrhu učenja i širenja dobrih praksi između hrvatskih regija na području razvoja ruralnog turizma.

#### *7.2.3. Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije u sklopu provedbe podmjere 19.4*

Podmjera 19.4. provodi se uspješno od početka provedbe projekta te se putem nje namiruju tekući troškovi koji se najvećim dijelom odnose na plaće zaposlenica, plaćanje najma ureda i knjigovodstvenog servisa. Do kraja 2020. godine LAG je podnio 16 Zahtjeva za isplatu a isplaćeno je njih 15. Kako se u toku provedbe lista prihvatljivih troškova kao i način pravdanja sredstava i modul mijenjato tako je i LAG svoje troškove prilagođavao uputama dobivenima od strane APPRRR-a. Trenutno se troškovi dijele na izravne i neizravne s time da se koristi model kako na neizravne troškove opada 15% izravnih te se oni ne dostavljaju na kontrolu APPRRR\_u, dok se izravni troškovi dostavljaju putem Agronet aplikacije kao i do sada.

Unutar redovnog rada između ostalog vode se i detaljne evidencije aktivnosti LAG-a koje se odnose, ne samo na provedbu LRS, već provedbu svih aktivnosti.

Sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Aktivnosti koje se odnose na provedbu LRS evidentiraju se i na način da se mjerek unutar Fokus područja koja su determinirana strategijom.

Do kraja 2020. godine postugnuti su gotovo svi zacrtani ciljevi, a neki su i vestruko premašeni. Zadovoljavanje ostalih ciljeva planira se do kraja 2023. godine kao što je i predviđeno strategijom. Ono što je višestruko premašeno je ovori o tome kako se LAG prepoznaće u velikom dijelu kao savjetodavno i edukacijsko tijelo, je ukupan broj održanih radionica (100) na kojima je sudjelovalo ukupno 1157 osoba. Ove aktivnosti i sudionici podijeljeni su unutar Fokusa područja: 1A, 1C, 6A i 6B.

Tablica 20: Praćenje provedbe LRS prema Fokus područjima određenima u LRS

P[1] <u>PRR</u>	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	<u>OSTVARENA VRIJEDNOST 2017.</u>	<u>OSTVARENA VRIJEDNOST 2018</u>	<u>OSTVARENA VRIJEDNOST 2019</u>	<u>OSTVARENA VRIJEDNOST 2020</u>	<u>UKUPNO</u>	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM	SC LRS
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0	0	0	2	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0	0	0	20	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	3	11	3	0	17	8	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	26	105	82	0	213	80	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1B*	Broj projekata među teritorijalne suradnje (nacionalna razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2) Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013	0	0	0	1	1	1	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	<u>OSTVARENJA</u>	<u>OSTVARENJA</u>	<u>OSTVARENJA</u>	<u>OSTVARENJA</u>	<u>UKUPNO</u>	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM	SC LRS
			<u>VRIJEDNOST</u> <u>2017.</u>	<u>VRIJEDNOST</u> <u>2018</u>	<u>VRIJEDNOST</u> <u>2019</u>	<u>VRIJEDNOST</u> <u>2020</u>						PRR	
1	1B*	Broj projekata transnacionalne suradnje (međunarodna razina) 19.3-19.3.1+19.3.2), Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013	0	0	0	0	0	0	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1C	Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	3	4	1	0	8	4	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1C*	Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	69	131	9	0	209	40	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
2	2A*	Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju	0	0	0	12	12	12	1.1.2.	4.1.1.	1.1.	4/4.1.	1
2	2A*	Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG	0	14	0	16	30	31	1.1.1.	6.3.1.	1.1.	6/6.3.	1
6	6A	Broj radnih mesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora	0	0	0	3	3	0	1.2.2.	6.4.1.	1.2.	6/6.4.	1

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	<u>OSTVARENJA</u>	<u>OSTVARENJA</u>	<u>OSTVARENJA</u>	<u>OSTVARENJA</u>	<u>UKUPNO</u>	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM	SC LRS
			<u>VRIJEDNOST 2017.</u>	<u>VRIJEDNOST 2018</u>	<u>VRIJEDNOST 2019</u>	<u>VRIJEDNOST 2020</u>						PRR	
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta	1	0	0	0	1	2	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3.	2
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta	6	0	0	0	6	20	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3.	2
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta	1	2	0	2	5	4	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti,	12	17	0	11	40	40	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	<u>OSTVARENJA VRIJEDNOST 2017.</u>	<u>OSTVARENJA VRIJEDNOST 2018</u>	<u>OSTVARENJA VRIJEDNOST 2019</u>	<u>OSTVARENJA VRIJEDNOST 2020</u>	<u>UKUPNO</u>	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
		smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mesta											
6	6B	Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	37	31	1	0	69	15	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6B	Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	354	321	14	0	689	150	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6B*	Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastrukture	0	0	0	0	0	15	2.1.1.	7.4.1.	2.1.	7/7.4.	2

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

### 7.3. DODATNI POKAZATELJI PROVEDBE I POSTIZANJA REZULTATA

- u 2017. godni zavedeno je ukupno 105 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2017. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava i Natječaja Zagrebačke županije,
- u 2018. godni zavedeno je ukupno 85 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2018. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava i Europskog socijalnog fonda,
- u 2019. godni zavedeno je ukupno 138 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2019. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava i Europskog socijalnog fonda, Agencije za elektroničke medije, Erasmus +, Mreže za ruralni razvoj i Zagrebačke županije,
- u 2020. godni zavedene su ukupno 42 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2020. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava i Erasmus +.

Tablica 21: Projekti koje je provodio LAG SAVA u svojstvu partnera ili nositelja financiranih iz programa EU te nacionalnih sredstava

Br	Godina provedbe	Naziv projekta	Nositelj/partner	Izvor	Iznos
1	rujan 2015. - studeni 2016.	Provjeda Podmjere 19.1. „Priprema pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.	Nositelj	Program ruralnog razvoja	425.904,93 kn
2	u tijeku	Podmjere 19.2. "Provjeda operacija unutar CLLD strategije"	Nositelj	Program ruralnog razvoja	7.121.202,17 kn
3	u tijeku	Podmjere 19.3. "Priprema i provjeda aktivnosti suradnje LAG-a"	Nositelj	Program ruralnog razvoja	356.060,11 kn
4	u tijeku	i Podmjere 19.4. "Tkući troškovi i animacija"	Nositelj	Program ruralnog razvoja	1.869.315,57 kn

Br	Godina provedbe	Naziv projekta	Nositelj/partner	Izvor	Iznos
5	lipanj 2016. do 31.12.2016.	Potpore LAG-u za sufinanciranje njegovog rada u 2016.godini Projekt "Održavanje 12 edukativnih radionica na području LAG-a SAVA"	Nositelj	Zagrebačka Županija	62.301,00 kn
6	4.studeni 2016.-2017	Promocija i izrada promotivnih materijala	Nositelj	Zagrebačka Županija	1.750,00 kn
7	3.listopad 2018.-2018	Provedba edukacijskih i animacijskih aktivnosti na području LAG-a "SAVA"	Nositelj	Zagrebačka Županija	62.301,00 kn
8	16.listopad 2018.-2018	Projekt opremanja multimedijalne učionice	Nositelj	Zagrebačka Županija	6.000,00 kn
9	14.5.2018.- 1.2020.	JobCollege SAVA	Partner Nositelj projekta EDUKA-centar lokalnog razvoja	Europski socijalni fond	177.194,76 kn
10	1.5.2019.- 31.12.2019	Cyber equality	Nositelj	Agencija za mobilnost i programe EU - erasmus +	133.206,00 kn
11	11.4.2019.- 31.12.2019.	Cyber akademija	Nositelj	Agencija za električne medije (AEM)	14.000,00 kn
12	5.2019.- 15.6.2019.	Inovativni oblici turizma i proizvodnje energije u poljoprivredi	Nositelj	MRR-Mreža za ruralni razvoj	11.800,00 kn
13	do 31.11.2019.	Znanje je moć vol.2	Nositelj	Zagrebačka županija	3.000,00 kn
14	u tijeku	RURality	Partneri		8.381,25 kn
16	u tijeku	Cyber me, Cyber you	Nositelj	Erasmus +	171.312,75 kn
17	u tijeku je procjena kvalitete	uLovi priliku	Nositelj	ESF	2.000.000,00 kn
18	u tijeku	Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije"	nositelj	Program ruralnog razvoja	1.478.840,00 kn
			UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA PO PROJEKTIMA		11.902.569,54 kn
			SREDSTVA KOJA ISKORIŠTAVA LAG		4.781.367,37 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

### 7.3. DODANA VRIJEDNOST PROVEDBE LRS

Umrežavanja i partnerstva – u evaluacijskom razdoblju LAG SAVA je član slijedećih organizacija:

- LEADER mreža Hrvatske;
- Mreža za ruralni razvoj (nacionalna ruralna mreža pri Ministarstvu poljoprivrede); predstavnici LAG-a su ujedno i članovi radne skupina „CLLD- LEADER“
- Zadruga za etično financiranje
- Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije

#### *7.3.1. Postignuća/dobrobiti/značaj realizacije Projekta za zajednicu u periodu evaluacije*

U razmatranom periodu po prvi puta su lokalna partnerstva dobila mogućnost kreiranja i financiranja razvojnih politika na lokalnoj razini, u jednom decentraliziranom pristupu (CLLD). U Republici Hrvatskoj ovaj pristup je novina i za izvršnu vlast na nacionalnoj razini te je shvaćanje uloge LAG-ova kao komplementarnog alata razvoja na lokalnoj razini koji nadopunjuje, fleksibilno, javne politike viših razina jednim djelom izostao. To se ogleda u ograničenjima u kreiranjima LAG natječaja, a koja su opisana u prethodnim poglavljima. Na području LAG-a SAVA može se reći da je donošenje LRS za period 2014- 2020 dočekan jednim dijelom i s nestrpljenjem, te da su očekivanja bila velika. U periodu evaluacije LAG je uspio unatoč početnim teškoćama organizirati stručnu službu, prilagoditi interne dokumente svojim potrebama, uspostaviti suradnju s lokalnim dionicima razvoja te izvršiti dio priprema za uspješan plasman dodijeljenih sredstava za provedbu LRS.

Pri tome treba reći da uobičajena boljka RH, a to je pretjerano administriranje, je i ovdje prisutno te izvještavanje, procedure, protokoli koji se neprekidno mijenjaju, oduzima znatno više vremena nego što se to činilo na početku Projekta.

#### *7.3.2. Postignuti odnosi LAG-a sa pripadnicima ciljanih skupina i krajnjim korisnicima*

LAG SAVA je uspostavio projektnu suradnju s pripadnicima ciljanih skupina prije svega iz javnog i gospodarskog sektora te s LAG-ovima sjeverozapadnog dijela RH, dok je potrebno poboljšati suradnju s pripadnicima civilnog sektora sa sjedištem na području LAG-a.

Uspostavljena je kvalitetna suradnja Ministarstvom poljoprivrede i APPRRR, koja kako vrijeme

prolazi dobiva na kvaliteti i postaje partnerska. Uvažavaju se svi zahtjevi javnopravnih tijela, a također se suradnja produbljuje na različitim radionicama koje se organiziraju ili od strane APPRRR i Ministarstva poljoprivrede ili krovnih organizacija LAG-ova (LEADER mreža Hrvatske, Hrvatska mreža za ruralni razvoj).

LAG SAVA je uspostavio suvremene kanale komuniciranja s krajnjim korisnicima – web stranica, e-mail, FB stranica. Uz ove kanale koristio je objave i priopćenja na lokalnim portalima i medijima (radio, televizija) te radionice i individualna savjetovanja. Do kraja ovog programskog razdoblja kao i u narednom planira se nastaviti ovaj model uz više medijskog praćenja koje ovisi o finansijskoj situaciji (a ona u dosadašnjem periodu nije dozvoljavala financiranje promocije u lokalnim i nacionalnim medijima).

#### *7.3.3. Postignuti odnosi među pripadnicima različitih skupina ciljanih skupina*

Odnos LAG-a s pripadnicima ciljanih skupina kontinuirano se proširivao i unaprjeđivao kroz korištenje različitih diseminacijskih metoda. Različite ciljane skupine susretale su se pri aktivnostima izrade LRS i njezinih izmjena te su se ovi akti donosili jednoglasno.

Prilikom priprema projekata male društvene infrastrukture je utvrđeno da se javni sektor rukovodio interesima pojedinih ciljanih skupina (djeca, mladi) u kreiranju projektnih prijava.

#### *7.3.4. Odnosi nastali uslijed realizacije projekta s važnim dionicima u lokalnoj zajednici*

U razmatranom periodu započela je intenzivnija suradnja s različitim dionicima razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini. LAG kroz provedbu svojih projekata ostvaruje uspješnu suradnju s raznim lokalnim dionicima. Prostor za napredak se vidi u kreiranju zajedničkih projekata namijenjenih različitim ciljanim skupinama.

Odnos sa privatnim i civilnim dionicima razvoja je u razvoju i dobiva na dinamici kroz provedbu prvih LAG natječaja te organizaciju i provedbu mnogobrojnih edukacija i radionica.

Suradnja sa civilnim sektorom je nedovoljna.

### *7.3.5. Procesi koji su doveli do postignuća/dobrobiti/značaja Projekta u zajednici*

Ocjena procesa je najvažniji dio ove evaluacije, unatoč neprekidnim tendencijama fokusiranja na rezultate.

Najznačajniji proces unutar ovog Projekta, a koji se naslanja na procese koji su prethodno nastali (LAG je osnovan 2013. godine) je način na koji se primjenjuje CLLD pristup na LAG razini pri kreiranju LRS te rukovođenja same organizacije.

Pristup „odozdo prema gore“ zahtijeva kontinuiran protok informacija na relaciji LAG - pripadnici ciljanih skupina i krajnjih korisnika, kao i veliki angažman svih članova organizacije (članova Skupštine, Upravnog odbora i stručne službe LAG-a).

U proteklom periodu uočeno je da se potrebe krajnjih korisnika ne poklapaju s mogućnostima financiranja iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, a to se odnosi na potrebe mlađih, djece, osoba starije životne dobi ali i za razvoj malog poduzetništve te poljoprivrede. Utvrđeno je da bi određene potrebe za populaciju mlađih, djece i starije životne dobi mogле biti zadovoljene i/ili ublažene kroz projekte financirane iz Erasmus+ programa, Europskog socijalnog fonda ili Europskog fonda za regionalni razvoj. Stoga će i u idućem razdoblju LAG kandidirati projekte kao nositelj ili partner na natječaje financirane iz navedenih fondova, a u razgovorima s nadležnim Ministarstvima zalagat će se za multisektorsko financiranje LAG- ova u idućem proračunskom razdoblju.

## **8. CILJ EVALUACIJE**

Cilj ove evaluacije bio je pružiti organizaciji uvid u procese rada, odlučivanja i rezultata ostvarenih u provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a SAVA 2014-2020, kako bi do kraja razdoblja na koje se Strategija odnosi (2023. ili n+3 godina) ostvarila u što većoj mjeri zadane ciljeve. Također evaluacija omogućava bolje planiranje i pripremu novog strateškog dokumenta za iduće programsko razdoblje od sedam godina te racionalno korištenje postojećih resursa organizacije kao i razvoj novih.

## Izvanredna situacija uzrokovana virusom COVID-19 u 2020. godini

Trenutno LAG SAVA kao i svi građani i pravni subjekti u Republici Hrvatskoj trpi posljedice zdravstvene krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Po naređenju Nacionalnog stožera civilne zaštite (te regionalnih i lokalnih stožera), nema primanja stranaka od sredine ožujka 2020. godine, a svi poslovi se obavljaju od kuće odnosno radom na daljinu, gdje je to moguće ili unaprijed određenim radom u smjenama..

Povremeno su zatvorene sve obrazovne ustanove od vrtića do sveučilišta, a u tim periodima nastava se održava online. Otežano je obavljanje poljoprivrednih radova te plasman poljoprivrednih proizvoda. Provode se i drugi oblici socijalnog distanciranja, u svrhu sprečavanja širenja virusa i preventivne zaštite ugroženih skupina stanovnika (kronični bolesnici i osobe starije životne dobi).

LAG SAVA koji ima poslovanje organizirano on-line odnosno u cloud sustavu, može dio poslova obavljati daljinski odnosno od kuće no ovaj način rada koristi se isključivo iznimno obzirom da su u tijeku Natječaji i potrebna je fizička prisutnost u uredu kako bi se sva pristigla dokumentacija obradila sukladno Pravilnicima.

Dobivene su i smjernice od strane APPRRR-a o tome kako provoditi započete aktivnosti, kojih se stručna služba LAG.a pridržava te se održavaju redoviti kontakti s APPRRR te unutar LAG-a.

Ovo stanje već sad ima posljedice na cijelokupno gospodarstvo, naročit na uslužne djelatnosti. Dodatno su usporene određene aktivnosti LAG-a koje su protivne pravilima socijalnog distanciranja. Sve navedeno može imati utjecaja i na krajnje rezultate provedbe LRS za razdoblje 2014-2020.

## 9. ZAKLJUČAK

Provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a SAVA 2014-2020 ovisila je o nizu faktora koji su dijelom bili izvan domene utjecaja samog LAG-a.

Uspostavljena je dobra komunikacija s javnim i gospodarskim sektorom, dok je suradnju s civilnim sektorom potrebno unaprijediti.

U idućem razdoblju potrebno je sukladno mogućnostima usprijed pandemije planirati aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se postigli rezultati i indikatori LRS.

LAG SAVA će se putem strukovne udruge LEADER mreža Hrvatske zalagati za veću slobodu u kreiranju strateških dokumenata i uvjeta natječaja u idućem programskom razdoblju, te mogućnost korištenja sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Također će putem iste organizacije tražiti načine jeftinijeg predfinanciranja od pozajmica poslovnih banaka.

U 2020. godini pokušat će se financirati projekti usmjereni na ranjive skupine iz drugih dostupnih izvora.

## 10. SAŽETAK

Izradu interne evaluacije Lokalne razvojne strategije koja obuhvaća period od početka provedbe projekta 2017. godine do kraja 2020 godine izradila je voditeljica LAG-a SAVA na temelju statističkih podataka koji se kontinuirano vode putem internih evidencija LAG-a SAVA.

Evaluacija je iznimno važna kako bi se dobio uvid u ostvarene ciljeve te se omogućilo ostvarivanje svih ostalih zadanih ciljeva do kraja 2023. godine. Isto tako evaluacija dosadašnje LRS čija izrada će započeti u 2021. godini.

Evaluacijom su sumirani svi dosadašnji podaci te su izrađene tablice i grafovi koji pokazuju iznose i brojeve projekata koji su financirani unutar određenog tipa operacije, iznose i brojeve projekata financirane iz određene JLS te su podaci raščlanjeni kako bi se vidjelo u koje sektore su uložena sredstva, u koji tip ulaganja te su prikazani podaci o nositeljima projekata tj. izdvojene su žene, mlađi a prikazani su i podaci o radnom iskustvu (isključivo poljoprivrednici koji plaćaju doprinose po osnovi poljoprivrede) te obrazovanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i veterine.

Osim podataka o dodijeljenim potporama LAG-a navedeni su i ukupni iznosi projekata tj. Investicija koji se provode uz dodatna vlastita sufinanciranja od strane nositelja projekta.

U periodu od 2017. do 2020. godine najviši iznos sredstava kroz sve do sada LAG Natječaje dodijeljen je korisnicima s područja Grada Jastrebarsko; 1.667.074,50 HRK a najniži korisnicima s područja Općine Luka; 317.095,11 HRK.

Ukupna ulaganja u projekte također su najviša na području Grada Jastrebarskog te iznose 2.262.200,30 HRK, a najmanje ulaganja također su na području Općine Luka i iznose 415.961,00 HRK.

Iznenađuje podatak kako su na području Općine Dubravica dodijeljena sredstva LAG-a u iznosu 754.340,50 HRK, što smatramo iznimnim uspjehom obzirom na broj stanovnika (1442). Ukupna ulaganja uz vlastita sufinanciranja korisnika na području Općine Dubravica su 1.219.668,04 HRK.

Na Natječaje LAG-a prijavljuju se korisnici iz svih JLS, no omjer nije ravnomjeren što pokazuju i statistički podaci prikazani u Prilogu .

Kroz Kriterije odabira u Natječajima namijenjenima poljoprivrednicima prednost su ostvarivali mlađi poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi (poljoprivrednici koji su zaposleni na OPG-u te si po osnovi poljoprivrede plaćaju doprinose), ekološki proizvođači kao i poljoprivrednici koji su se obrazovali iz područja poljoprivrede, veterine ili prehrambene tehnologije. Namjera da se na ovaj način potaknu mlađe i sposobljene osobe na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom sukladno podacima u Prilogu I pokazala se uspješnom. Tako je potporu ostvarilo 25 mlađih poljoprivrednika i to u ukupnom iznosu od 3.161.689,43 HRK. Za projekte koje provode poljoprivrednici upisani u Upisnik ekoloških proizvođača, njih 6, dodijeljeno je 773.143,50 HRK. Iznimno uspješnim smatramo i činjenicu kako su potpore

ostvarili poljoprivrednici koji su educirani u području poljoprivrede, veterine i prehrambene tehnologije i to :

25 poljoprivrednika sa završenim Agronomskim ili Veterinarskim fakultetom, 9 poljoprivrednika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem iz područja poljoprivrede, 9 poljoprivrednika koji su završili stručna usavršavanja iz područja poljoprivrede te 5 poljoprivrednika koji su zaposleni na svojim poljoprivrednim gospodarstvima duže od 2 godine.

U narednom razdoblju kroz animacijske aktivnosti pokušat će se animirati korisnike iz JLS-ova u kojima je zamjetna smanjena aktivnost po pitanju prijava na Natječaje kao što su Općine Luka, Klinča Sela i Stupnik kako bi se animiralo što više korisnika na apliciranje za sredstva LAG-a te će se nastaviti s pozitivnim poticanjem mladih, obrazovanih i ekoloških poljoprivrednika na provedbu projekata.

## **11. POPIS TABLICA**

Tablica 1: Ukupno odobrena sredstva LAG-a SAVA za provedbu LRS .....	7
Tablica 2: Popis izmjena LRS unutar perioda evaluacije .....	8
Tablica 3: Strateški razvojni ciljevi (SC), prioritetne mjere (M) i prioritetni tipovi operacija (TO) .....	8
Tablica 4: Vrednovanje provedbe ukupne LRS putem krovnih pokazatelja (indikatora) rezultata 2018. i do kraja programskog i realizacijskog razdoblja 2023. ....	10
Tablica 5: Praćenje provedbe LRS sukladno odabranim Fokus područjima.....	11
Tablica 6. Popis internih akata.....	24
Tablica 7: Krovni pokazatelji (result indicators) za SC1:.....	27
Tablica 8: broj izdanih odluka unutar SC1.....	28
Tablica 9: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 1.1.1. ....	29
Tablica 10: Ukupni iznos dodijeljenih sredstava iz TO 1.1.1. po JLS.....	30
Tablica 11: Ukupni iznos projekata financiranih kroz TO 1.1.1. po JLS.....	31
Tablica 12: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 1.1.2.:.....	32
Tablica 13: Dodijeljena sredstva unutar TO 1.1.2 po JLS .....	33
Tablica 14: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.1.2 po JLS .....	33
Tablica 15: Krovni pokazatelji (result indicators) za SC2 .....	36
Tablica 16: broj izdanih odluka unutar SC2 .....	36
Tablica 17: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 2.1.1. ....	37
Tablica 18: Dodijeljena sredstva unutar TO 2.1.1. po JLS .....	38
Tablica 19: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 2.1.1. po JLS .....	38
Tablica 20: Praćenje provedbe LRS prema Fokus područjima određenima u LRS .....	41
Tablica 21: Projekti koje je provodio LAG SAVA u svojstvu partnera ili nositelja financiranih iz programa EU te nacionalnih sredstava .....	45

## **12. POPIS GRAFOVA:**

Graf 1: Ukupni iznos dodijeljenih sredstava iz TO 1.1.1. po JLS .....	30
Graf 2: Ukupni iznos projekata financiranih kroz TO 1.1.1. po JLS.....	31
Graf 3: Dodijeljena sredstva unutar TO 1.1.2 po JLS .....	33
Graf 4: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.1.2 po JLS .....	34
Graf 5: Dodijeljena sredstva unutar TO 2.1.1. po JLS .....	38
Graf 6: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 2.1.1. po JLS .....	39


## PRILOG 1 – Statistički prikaz provedenih Natječaja LAG-a SAVA

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA						
	TO 1.1.1. - 1 natječaj	TO 2.1.1.	TO 1.1.2.	TO 2.1.1.- 2 natječaj	TO 1.1.1. - 2 Natječaj	UKUPNO
Brdovec	kn -	kn 222.375,00	kn 165.000,00		kn 112.912,50	kn 500.287,50
Dubravica	kn 111.678,00	kn 222.375,00	kn 307.375,00		kn 112.912,50	kn 754.340,50
Jastrebarsko	kn 446.712,00	kn 222.375,00	kn 659.250,00		kn 338.737,50	kn 1.667.074,50
Klinča Sela	kn 111.678,00	kn 222.375,00	kn -		kn -	kn 334.053,00
Luka	kn -	kn -	kn 91.270,11		kn 225.825,00	kn 317.095,11
Marija Gorica	kn 223.356,00	kn 222.375,00	kn 207.900,00		kn -	kn 653.631,00
Pušća	kn -		kn 222.375,00	kn 223.185,00	kn 112.912,50	kn 558.472,50
Samobor	kn -	kn 222.375,00	kn 222.375,00		kn 338.737,50	kn 783.487,50
Stupnik	kn -	kn 222.375,00	kn -		kn 225.825,00	kn 448.200,00
Sveta Nedjelja	kn 335.034,00	kn 222.375,00	kn -		kn 112.912,50	kn 670.321,50
Zaprešić	kn 335.034,00	kn -	kn 194.077,93		kn 225.825,00	kn 754.936,93
UKUPNO	kn 1.563.492,00	kn 1.779.000,00	kn 2.069.623,04	kn 223.185,00	kn 1.806.600,00	kn 7.441.900,04


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

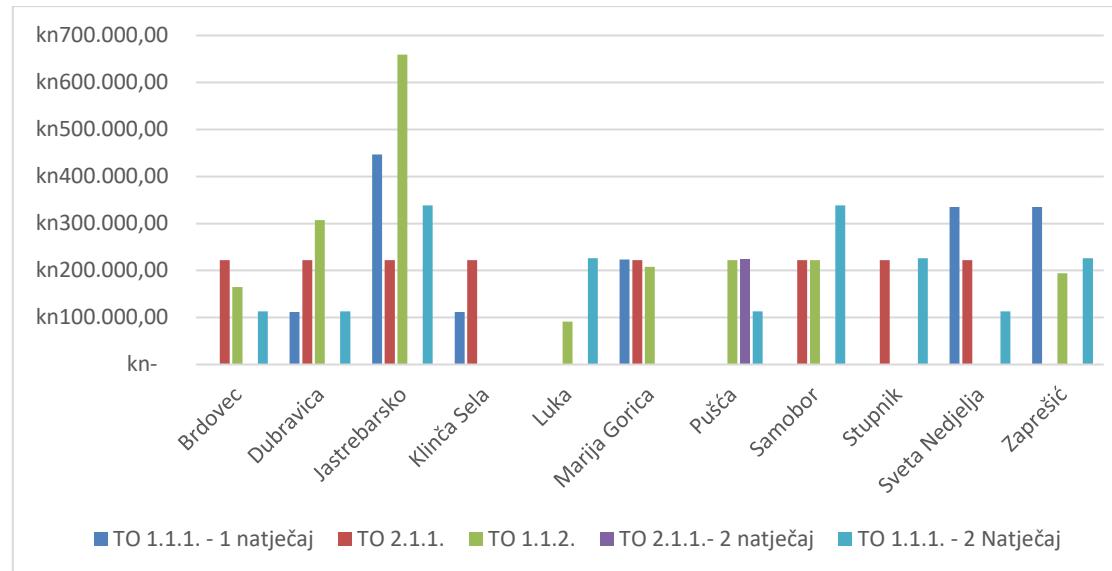

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

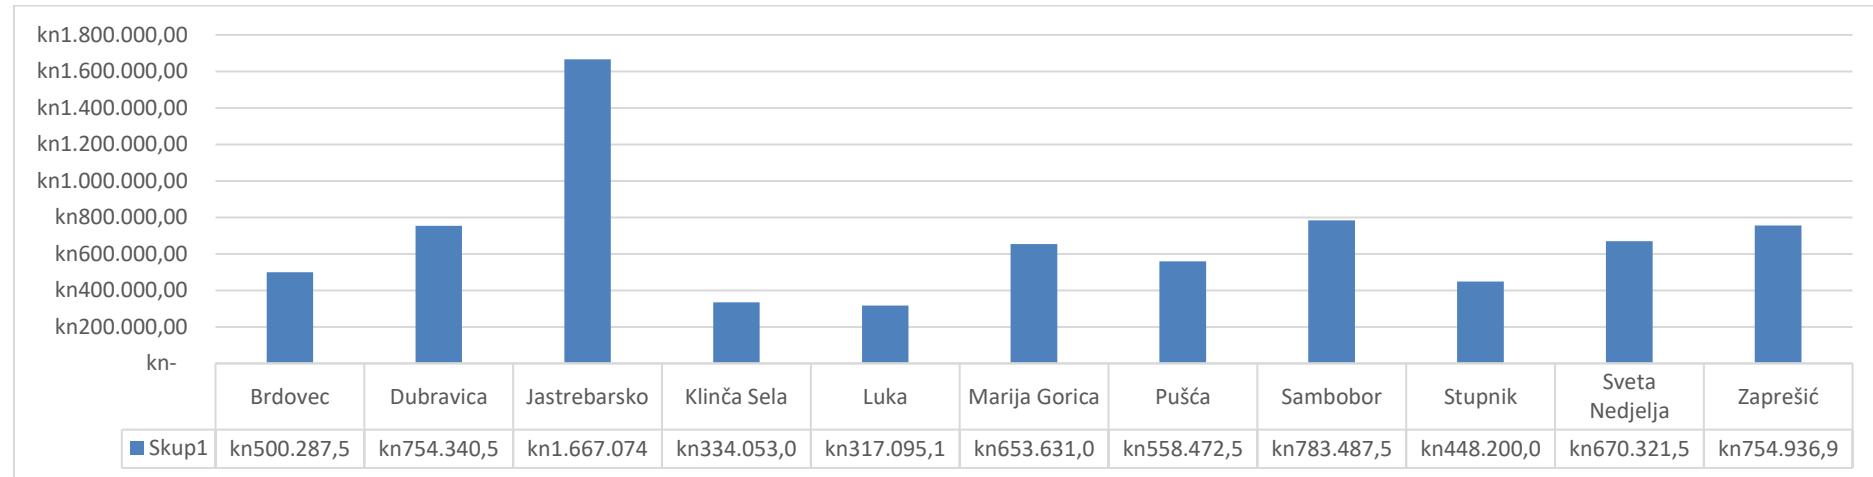


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA						
	TO 1.1.1. - 1 natječaj	TO 2.1.1.	TO 1.1.2.	TO 2.1.1. - 2 natječaj	TO 1.1.1. - 2 Natječaj	UKUPNO
Brdovec	- kn	317.722,50 kn	330.000,00 kn		115.000,00 kn	762.722,50 kn
Dubravica	121.000,00 kn	319.528,04 kn	650.140,00 kn		129.000,00 kn	1.219.668,04 kn
Jastrebarsko	488.165,75 kn	283.893,75 kn	1.139.000,00 kn		351.140,80 kn	2.262.200,30 kn
Klinča Sela	205.463,00 kn	305.359,75 kn	- kn		- kn	510.822,75 kn
Luka	- kn	- kn	189.461,00 kn		226.500,00 kn	415.961,00 kn
Marija Gorica	232.450,00 kn	242.987,50 kn	297.000,00 kn		- kn	772.437,50 kn
Pušća	- kn		490.000,00 kn	292.500,00 kn	113.000,00 kn	895.500,00 kn
Samobor	- kn	286.983,75 kn	360.500,00 kn		409.000,00 kn	1.056.483,75 kn
Stupnik	- kn	624.850,00 kn	- kn		232.000,00 kn	856.850,00 kn
Sveta Nedjelja	350.875,00 kn	663.750,00 kn	- kn		117.596,25 kn	1.132.221,25 kn
Zaprešić	341.083,25 kn	- kn	277.254,19 kn		228.000,00 kn	846.337,44 kn


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

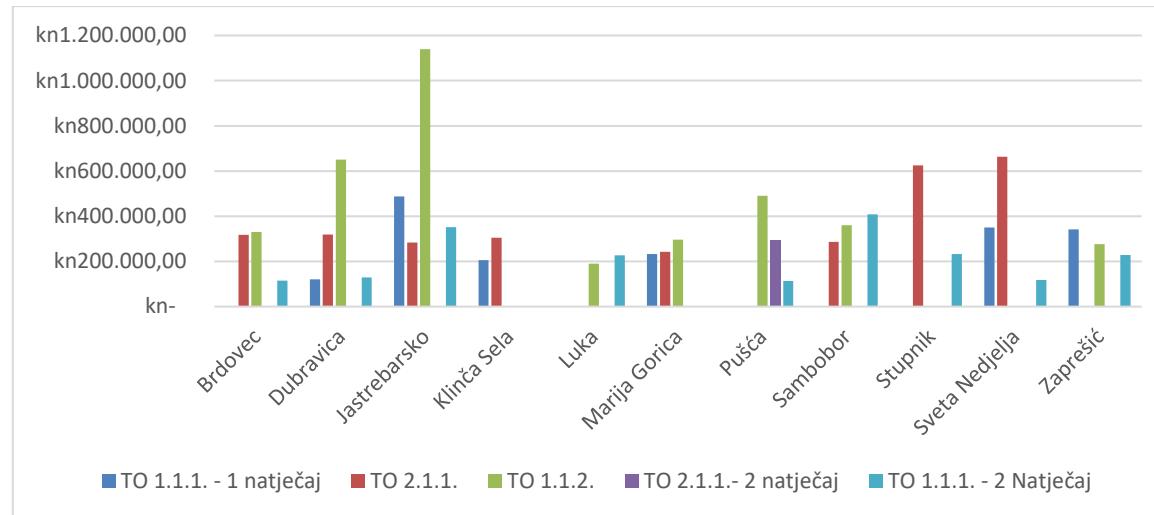

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

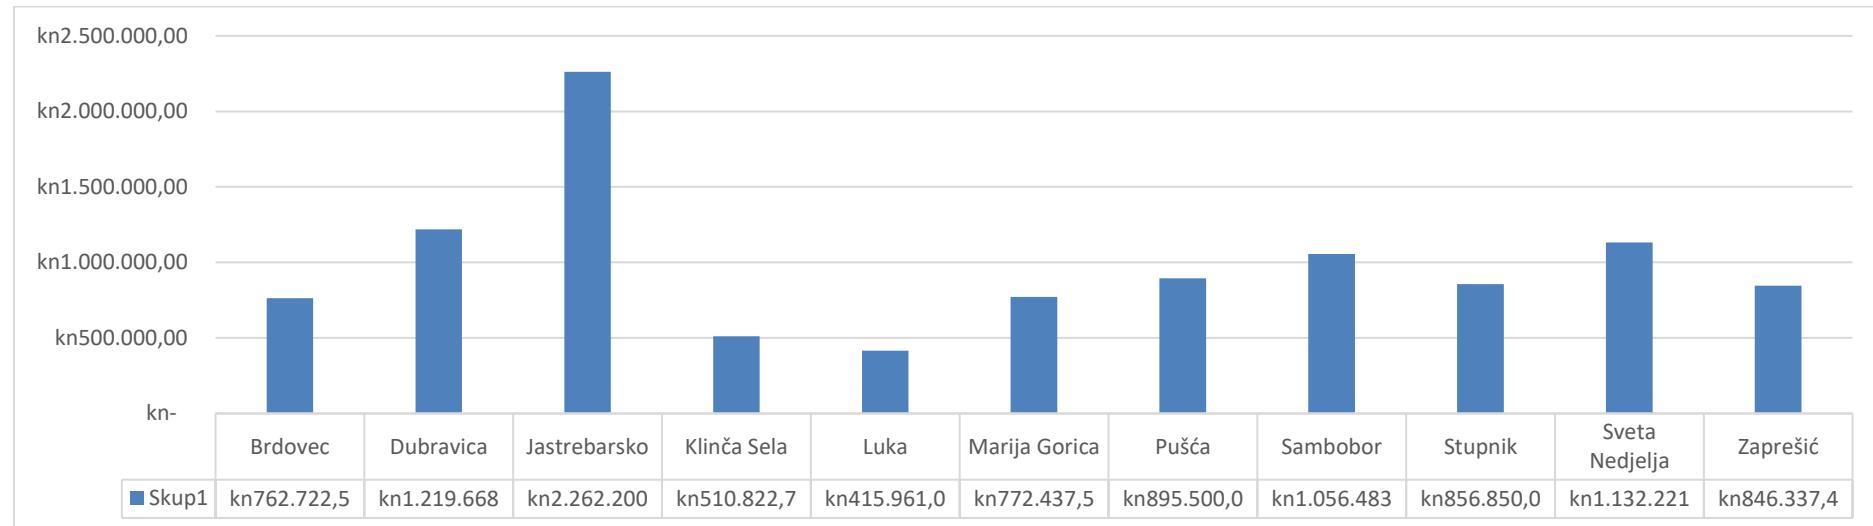


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja

	to 1.1.1 -1. natječaj		to 2.1.1.-1 natječaj		to 1.1.2.		to 2.1.1.-2. natječaj		to 1.1.1 -2. natječaj		ukupno
sektor	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	
voćarstvo	7	781.746,00 kn			2	316.875,00 kn			3	338.737,50 kn	1.437.358,50 kn
vinogradarstvo	3	335.034,00 kn			2	430.275,00 kn			3	338.737,50 kn	1.104.046,50 kn
povrćarstvo	1	111.678,00 kn			1	120.000,00 kn			1	112.912,50 kn	344.590,50 kn
cvjećarstvo	1	111.678,00 kn			1	194.077,93 kn			1	112.912,50 kn	418.668,43 kn
pčelarstvo	1	111.678,00 kn							1	112.912,50 kn	224.590,50 kn
stočarstvo	1	111.678,00 kn			6	1.011.200,11 kn			2	225.825,00 kn	1.348.703,11 kn
ratarstvo	0	- kn							4	451.650,00 kn	451.650,00 kn
aromatično i ljekovito bilje	0	- kn							1	112.912,50 kn	112.912,50 kn
javna infrastruktura	0	- kn	8	1.779.000,00 kn			1	223.185,00 kn	0	- kn	2.002.185,00 kn
ukupno	14	1.563.492,00 kn	8	1.779.000,00 kn	12	2.072.428,04 kn	1	223.185,00 kn	16	1.806.600,00 kn	
tip ulaganja	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	
mehanizacija	6	670.068,00 kn			10	1.655.975,11 kn			12	1.354.950,00 kn	3.680.993,11 kn
oprema	3	335.034,00 kn	4	889.500,00 kn					4	451.648,00 kn	1.676.182,00 kn
trajni nasadi	5	558.390,00 kn			2	416.452,93 kn			0		974.842,93 kn
kombinacija	4								0		- kn
građenje	0	- kn	4	889.500,00 kn			1	223.185,00 kn	0		1.112.685,00 kn
ukupno	18	1.563.492,00 kn	8	1.779.000,00 kn	12	2.072.428,04 kn	1	223.185,00 kn	16	1.806.598,00 kn	
nositelj projekta	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	
mladi (do 41. g.)	8	893.424,00 kn			6	1.026.227,93 kn			11	1.242.037,50 kn	3.161.689,43 kn
žene	4	446.712,00 kn	1	222.375,00 kn	2	214.500,00 kn	1	223.185,00 kn	2	225.825,00 kn	1.332.597,00 kn
ekološka poljoprivreda	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	
eko proizvodnja	2	223.356,00 kn	0		3	436.875,00 kn	0		1	112.912,50 kn	773.143,50 kn
radno iskustvo/obrazovanje	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	br. projekata	iznos	
radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž)	2	223356	0		2	387.375,00 kn	0	0	1	112.912,50 kn	723.643,50 kn
tečaj min 120 sat	3	335034	0		4	846.727,93 kn	0	0	2	225.825,00 kn	1.407.586,93 kn
srednja škola	4	446712	0				0	0	5	564.562,50 kn	1.011.274,50 kn
fakultet	4	446712	0		1	222.375,00 kn			8	903.300,00 kn	1.572.387,00 kn


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru

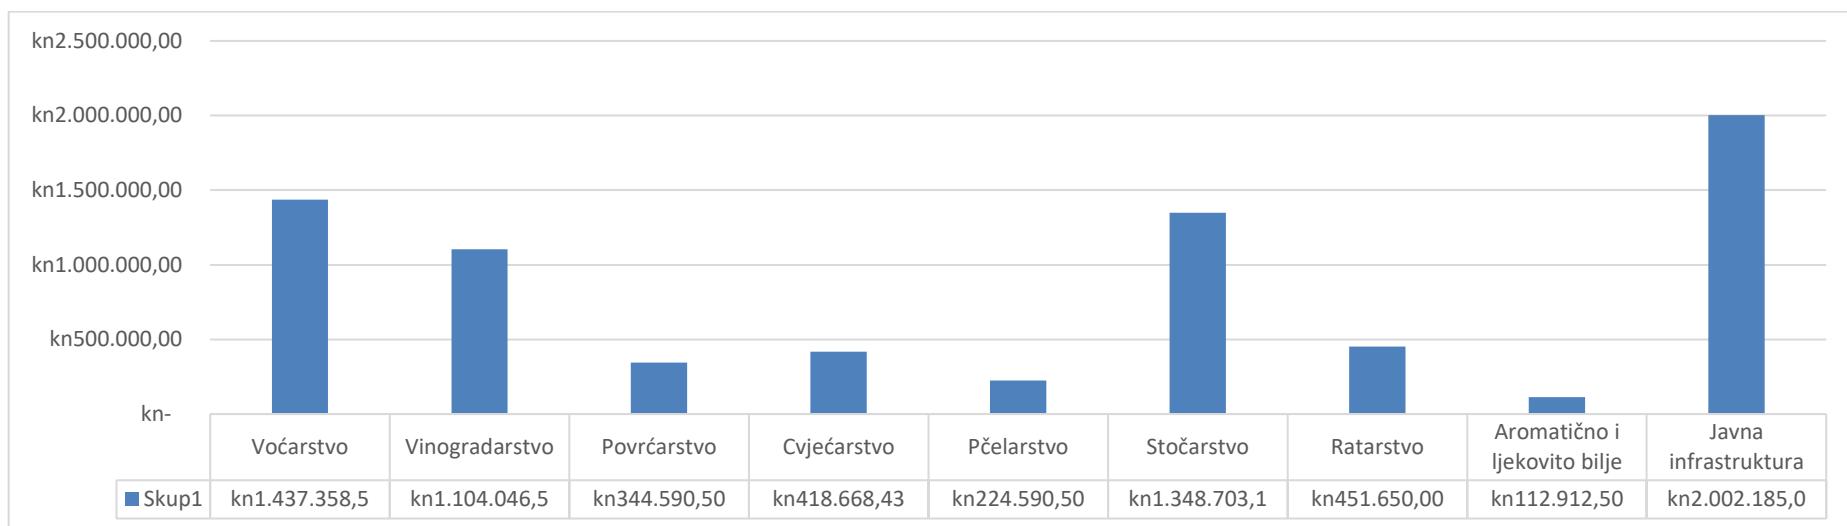


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja

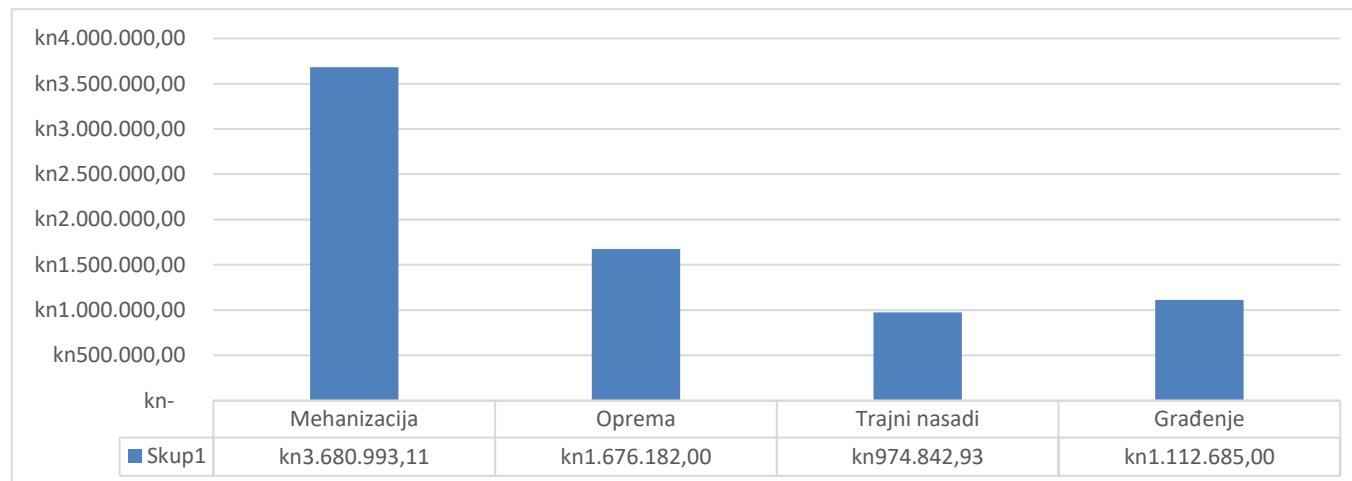

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika

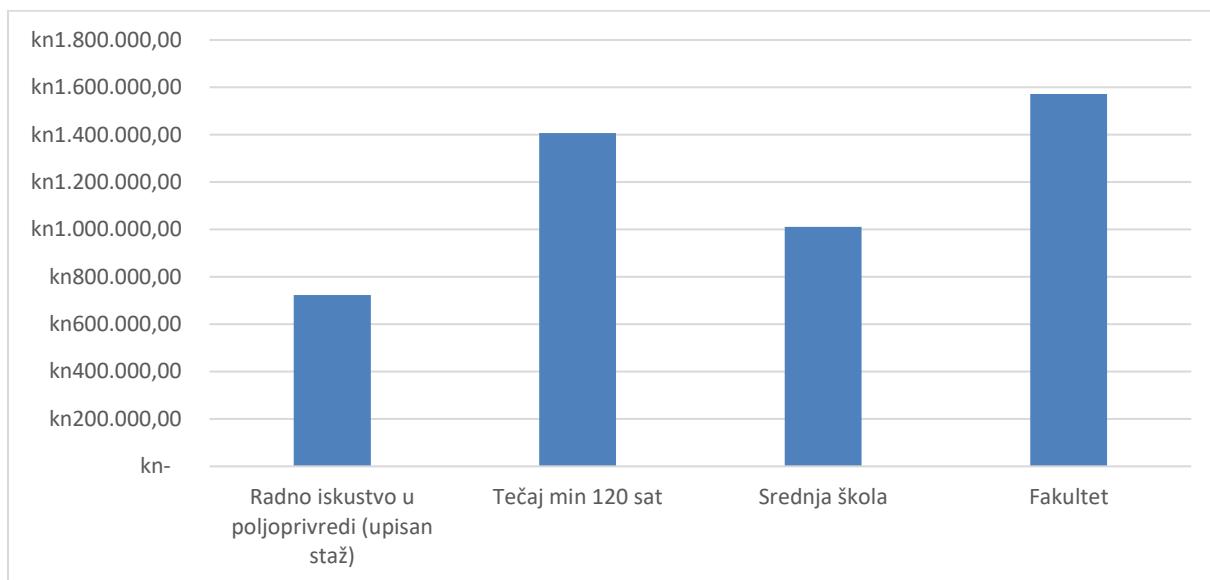

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

## **POPIS TABLICA PRILOGA 1:**

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA .....	1
Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA .....	3
Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja .....	5

## **POPIS GRAFOVA PRILOGA 1:**

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO) .....	2
Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) .....	2
Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA.....	4
Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) ...	4
Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru.....	6
Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja .....	6
Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika.....	7
